

(様式1)

釜石市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

釜石市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	14,655	10,226
24	27,799,872	11,508,491	
25	27,822,729	15,353,493	
26	32,710,661	24,374,819	
27	20,947,345	28,598,122	
28	5,079,653	0	
合 計		114,374,915	79,845,151

<参考>	釜石市東日本大震災 復興交付金基金残高	釜石市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	釜石市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	68,588,225	9,871	45,796,561

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	884,693	442,930
24	6,489,753	3,335,744	
25	5,157,045	1,375,626	
26	2,697,136	2,184,466	
27	2,961,651	4,985,099	
28	3,203,644	0	
合 計		21,393,922	12,323,865

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

釜石市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)


No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	片岸等	市	市	直接	継続	92,870	24	~	28	23	0	0	0	24年4月調査着手。 25年4月着手。試掘及び緊急発掘調査を実施。 26年4月着手。試掘調査及び25年度に実施した緊急発掘調査の報告書を刊行した。
																	24	20,160	4,377	-	
																	25	9,172	2,165	-	
																	26	0	1,570	-	
																	27	0	2,378	-	
																	28	0	0	-	
																	累計	29,332	0	10,490	
28	◆	A	-	4	-	1	史跡周知促進事業	夫婦くろべ・箱崎横瀬遺跡外	市	市	直接	継続	6,951	24	~	28	23	0	0	0	24年5月委託発注。 25年4月及び6月委託発注。震災により損壊した文化財の修復等 平成26年度は、文化財の修復及び標柱の設置等は行わず、経費は発生していない。
																	24	1,359	232	-	
																	25	4,201	3,568	-	
																	26	0	0	-	
																	27	0	0	-	
																	28	0	0	-	
																	累計	5,560	0	3,800	
38	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	片岸等	県	県	直接	継続	58,537	24	~	28	23	0	0	0	24年4月から24年9月 試掘等調査 平成25年9月 試掘等調査 平成26年12月 試掘等調査 平成27年 4月、6~9月 試掘等
																	24	4,490	2,524	-	
																	25	11,640	1,221	-	
																	26	0	2,736	-	
																	27	0	7,805	-	
																	28	0	0	-	
																	累計	16,130	0	14,286	
56	A	-	1	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(体育館整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	継続	129,684	24	~	28	23	0	0	0	25年7月委託発注。27年3月工事発注。平成30年2月完成予定。
																	24	1,893	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	18,937	20,830	-	
																	27	0	76,431	-	
																	28	76,431	0	-	
																	累計	97,261	0	97,261	
57	A	-	2	-	1	-	唐丹地区新校舎建設事業(備蓄倉庫整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	継続	30,720	24	~	28	23	0	0	0	25年7月委託発注。27年3月工事発注。平成30年2月完成予定。
																	24	666	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	6,666	7,332	-	
																	27	0	13,146	-	
																	28	13,146	0	-	
																	累計	20,478	0	20,478	
75	◆	A	-	1	-	1	唐丹地区新校舎建設事業(体育館整備)	小白浜唐丹小中学校	市	市	直接	継続	163,710	24	~	28	23	0	0	0	25年7月委託発注。27年3月工事発注。平成30年2月完成予定。
																	24	4,780	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	0	26,172	-	
																	27	21,392	104,796	-	
																	28	104,796	0	-	
																	累計	130,968	0	130,968	

76	◆	A	-	1	-	1	-	2	唐丹地区新校舎建設事業 (公民館整備)	小白浜 唐丹小中 学校	市	市	直接	廃止	3,750	24	~	24	23	0	0	0	24年7月委託発注
																			24	3,000	0	3,000	
																			25	0	0	-	
																			26	0	0	-	
																			27	0	0	-	
																			28	0	0	-	
累計	3,000	0	3,000																				
77	◆	A	-	1	-	1	-	3	震災復興メモリアル伝承(地元紙データベース更新)事業	東部等	市	市	直接	完了	1,000	24	~	24	23	0	0	0	24年11月 測量機器操作説明会
																			24	800	779	21	
																			25	0	0	0	
																			26	0	0	0	
																			27	0	0	0	
																			28	0	0	0	
累計	800	0	779	21																			
105	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	(釜石市)	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23	0	0	0	24年11月 測量機器操作説明会
																			24	124	9	115	
																			25	0	0	0	
																			26	0	0	0	
																			27	0	0	0	
																			28	0	0	0	
累計	124	0	9	115																			

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
		24	4,614	0	2,533	115
		25	11,640	0	1,221	0
		26	0	0	2,736	0
		27	0	0	7,805	0
		28	0	0	0	0
58,693	都道府県交付分 計	16,254	0	14,295	115	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
		24	32,658	0	5,388	3,021
		25	13,373	0	5,733	0
		26	25,603	0	55,904	0
		27	21,392	0	196,751	0
		28	194,373	0	0	0
428,685	市町村交付分 計	287,399	0	263,776	3,021	
487,378	合計	303,653	0	278,071	3,136	

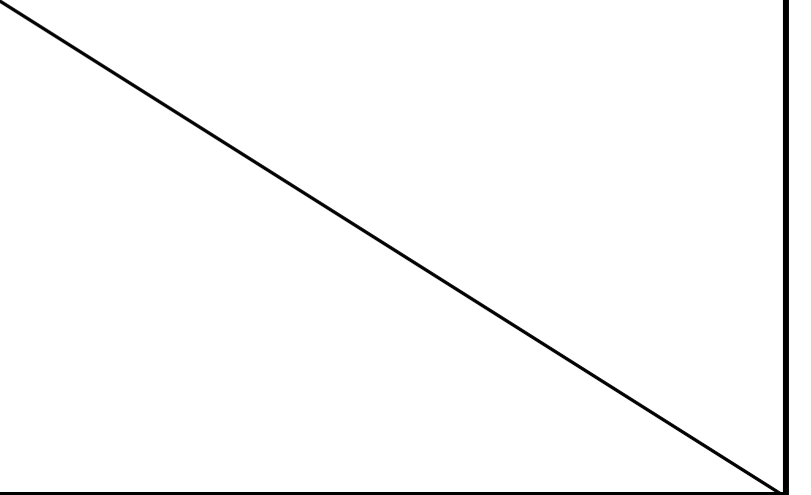

(様式2C)

釜石市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
32	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	室浜	県	市	間接	継続	509,750	24	~	28	23	0	0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。
																	24	228,750	382,312	-	
																	25	102,375	0	-	
																	26	51,187	0	-	
																	27	0	▲ 95,725	-	
																	28	0	0	-	
累計	382,312	0	286,587	0																	
33	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	仮宿	県	市	間接	継続	136,600	24	~	28	23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。 7月不動産価格鑑定評価業務発注。 25年6月用地買収、8月調査設計業務委託、9月不動産価格鑑定 評価業務発注。 26年6月~用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注 27年7月~設計業務発注、9月~用地買収、12月~補償契約
																	24	102,450	6,123	-	
																	25	0	5,290	-	
																	26	0	59,163	-	
																	27	0	7,586	-	
																	28	0	0	-	
累計	102,450	0	78,162	0																	
34	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業	桑ノ浜	県	市	間接	継続	497,800	24	~	28	23	0	0	0	24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。 協定変更(~H29.3)
																	24	255,000	373,350	-	
																	25	78,900	0	-	
																	26	39,450	0	-	
																	27	0	0	-	
																	28	0	0	-	
累計	373,350	0	373,350	0																	
35	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業	花露辺	県	市	間接	継続	645,794	23	~	28	23	6,045	5,755	0	24年3月測量調査設計業務委託発注。 24年7月実施設計業務委託発注。 25年5月~用地買収、10月水産業用地造成委託、26年3月測量調 査及び整備等業務委託発注。 26年4月~用地買収、12月~補償契約、27年3月整備等業務委 託発注 27年7月委託契約変更、8月~補償契約、28年1月不動産鑑定
																	24	247,741	46,300	-	
																	25	0	404,144	-	
																	26	230,559	27,415	-	
																	27	0	▲ 12	-	
																	28	0	0	-	
累計	484,345	0	483,602	0																	
36	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災機能強化事業	大石	県	市	間接	継続	478,600	24	~	28	23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評 価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月 画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委 託発注。 H25.9 不動産価格鑑定評価業務、10月 用地測量業務、12月 文 化財調査、H26.2 測量調査設計業務を発注。 26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月~用地 買収、文化財発掘調査 27年7月~設計業務発注、文化財発掘調査、10月~用地買収、 補償契約
																	24	169,200	34,901	-	
																	25	0	7,901	-	
																	26	122,250	86,334	-	
																	27	67,500	76,780	-	
																	28	0	0	-	
累計	358,950	0	205,916	0																	

37	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	仮宿等	県	市	間接	継続	1,217,760	24	~	28	23	0	0	24年10月工事発注。
																	24	541,583	31,691	-
																	25	371,736	83,256	-
																	26	0	0	25年6月工事発注。
																	27	0	171,092	27年10月工事発注
																	28	0	0	
累計	913,319	0	286,039	0																
39	C	-	1	-	1	-	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	大船渡・釜石	県	県	直接	完了	276,000	24	~	27	23	0	0	25年1月下旬工事契約。(複数年契約)
																	24	86,800	9,300	-
																	25	51,150	128,650	-
																	26	46,500	41,850	-
																	27	29,450	19,009	15,091
																	28	0	0	
累計	213,900	0	198,809	15,091																
40	C	-	8	-	1	-	岩手県水産技術センター施設災害復旧事業	平田	県	県	直接	完了	1,385,963	23	~	25	23	307,753	292,155	24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その1工事発注。25年3月、本復旧その2工事発注。研究施設完了予定：26年3月
																	24	362,655	172,253	-
																	25	369,063	249,710	-
																	26	0	105,696	219,657
																	27	0	0	0
																	28	0	0	
累計	1,039,471	0	819,814	219,657																
85	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業	新浜町	県	市	間接	継続	639,620	24	~	28	23	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。
																	24	119,090	5,382	-
																	25	360,624	0	-
																	26	0	0	
																	27	0	34,749	28年2月~設計業務発注
																	28	0	0	
累計	479,714	0	40,131	0																
87	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	釜石市	市	市	直接	継続	1,476,588	24	~	32	23	0	0	
																	24	603,598	0	-
																	25	112,375	0	-
																	26	70,145	12,412	
																	27	285,290	5,044	
																	28	109,859	0	
累計	1,181,267	0	17,456	0																
89	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業	佐須	県	市	間接	継続	316,870	24	~	28	23	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。
																	24	94,027	14,568	-
																	25	143,625	28,350	-
																	26	0	80,493	-
																	27	0	26,344	-
																	28	0	0	
累計	237,652	0	149,755	0																
90	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業	嬉石等	市	民間	直接	継続	7,108,590	24	~	28	23	0	0	
																	24	605,000	0	-
																	25	4,282,155	605,000	-
																	26	0	0	-
																	27	0	1,819,968	-
																	28	0	0	
累計	4,887,155	0	2,424,968	0																

91	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業	嬉石	市	市	直接	完了	525,000	24	~	25	23	0	0	25年2月用地買収仮契約。同年3月用地取得。	
																			24	241,600	63,726	177,874	
																			25	178,400	42,418	135,982	不発弾調査及び用地造成工事について、事業完了。
																			26	0			
																			27	0			
																			28	0			
累計	420,000	0	106,144	313,856																			
108		C	-	5	-	8	-		漁業集落防災機能強化事業	根浜	県	市	間接	継続	421,168	24	~	28	23	0	0	25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																			24	13,500	34,290	-	
																			25	20,790	0	-	
																			26	0	0	-	
																			27	201,395	281,585	協定変更(~H29.3)	
																			28	80,190			
累計	315,875	0	315,875	0																			
109		C	-	5	-	9	-		漁業集落防災機能強化事業	箱崎	県	市	間接	継続	723,700	24	~	28	23	0	0		
																			24	131,250	0	-	
																			25	131,906	5,426	-	
																			26	0	146,285	26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注	
																			27	241,734	103,643	27年6月~補償契約、7月~設計業務委託、3月~造成工事	
																			28	37,884			
累計	542,774	0	255,354	0																			
110		C	-	5	-	10	-		漁業集落防災機能強化事業	箱崎白浜	県	市	間接	継続	157,384	24	~	28	23	0	0		
																			24	10,500	0	-	
																			25	51,242	36,299	-	
																			26	0	5,008	25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月道路改良工事変更契約、9月設計業務変更契約、12月造成工事発注	
																			27	31,245	9,149	27年7月~設計業務委託、28年2月~造成工事	
																			28	25,050			
累計	118,037	0	50,456	0																			
111		C	-	5	-	11	-		漁業集落防災機能強化事業	両石	県	市	間接	継続	2,416,399	24	~	28	23	0	0		
																			24	79,500	0	-	
																			25	279,000	49,870	-	
																			26	0	▲ 3,826	26年1月~用地買収。2月測量調査設計業務委託発注。 26年8月~用地買収、9月設計業務変更契約	
																			27	933,320	778,015	27年7月~設計業務委託、28年2月~造成工事	
																			28	24,956			
累計	1,316,776	0	824,059	0																			
112		C	-	5	-	12	-		漁業集落防災機能強化事業	尾崎白浜	県	市	間接	継続	93,965	24	~	28	23	0	0		
																			24	9,000	0	-	
																			25	26,475	8,019	-	
																			26	0	20,869	26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月用地買収、造成工事発注	
																			27	34,998	3,017		
																			28				
累計	70,473	0	31,905	0																			
113		C	-	5	-	13	-		漁業集落防災機能強化事業	本郷	県	市	間接	継続	129,000	24	~	28	23	0	0	25年3月建物補償算定業務委託発注。	
																			24	52,500	2,956	-	
																			25	44,250	35,190	-	
																			26	0	46,461	25年11月~用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務委託発注。 26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月~補償契約	
																			27	0	▲ 12,081		
																			28				
累計	96,750	0	72,526	0																			

128	◆	C	-	7	-	1	-	2	水産業共同利用施設復興整備事業	釜石市内	市	民間	直接	継続	250,000	25	~	28	23	0	0		9業者に対し交付決定・支出済。 14事業者に対し、交付決定済み 12事業者に対し、交付決定実施。
																			24	0	0	-	
																			25	200,000	60,507	-	
																			26	0	73,311	-	
																			27	0	42,454	-	
																			28	0	0	-	
累計	200,000	0	176,272	0																			
129		C	-	4	-	1	-		被災地域農業復興総合支援事業	唐丹町	県	市	間接	完了	55,242	25	~	25	23	0	0		H25.11入札。H26.3納品・事業完了。
																			24	0	0	-	
																			25	41,431	19,416	22,015	
																			26	0	0	-	
																			27	0	0	-	
																			28	0	0	-	
累計	41,431	0	19,416	22,015																			
130	◆	C	-	4	-	1	-	1	共同利用資機材整備事業	唐丹町	県	市	間接	完了	1,361	25	~	25	23	0	0		H25.11入札。H26.3納品・事業完了。
																			24	0	0	0	
																			25	544	480	64	
																			26	0	0	-	
																			27	0	0	-	
																			28	0	0	-	
累計	544	0	480	64																			
137	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	釜石市	県	県	直接	継続	116,151	25	~	32	23	0	0		
																			24	0	0	0	
																			25	60,764	47,800		
																			26	32,156	34,320		
																			27	0	0		
																			28	0	0		
累計	92,920	0	82,120	0																			
144		C	-	5	-	14	-		漁業集落防災機能強化事業	唐丹地区	県	市	間接	継続	877,000	25	~	28	23	0	0		26年2月設計業務委託発注。(H25.H26の2ヶ年契約) 26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処理場建設工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注 27年8月~管路布設工事
																			24	0	0	-	
																			25	9,750	9,963	-	
																			26	498,000	368,879	-	
																			27	75,000	178,236	-	
																			28	75,000	0	-	
累計	657,750	0	557,078	0																			
157		C	-	7	-	2	-		水産業共同利用施設復興整備事業(漁港施設)	仮宿漁港他	市	市	直接	継続	40,000	26	~	28	23	0	0		
																			24	0	0	-	
																			25	0	0	-	
																			26	7,500	0	-	
																			27	22,500	9,332	-	
																			28	0	0	-	
累計	30,000	0	9,332	0																			

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	313,798	0	297,910	0
		24	2,503,546	0	1,113,426	0
		25	2,143,625	0	1,119,764	22,079
		26	1,020,102	0	1,018,947	219,657
		27	1,614,642	0	1,581,387	15,091
		28	243,080	0	0	0
11,096,127	都道府県交付分 計	7,838,793	0	5,131,434	256,827	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	1,450,198	0	63,726	177,874
		25	4,772,930	0	707,925	135,982
		26	77,645	0	85,723	0
		27	307,790	0	1,876,798	0
		28	109,859	0	0	0
9,400,178	市町村交付分 計	6,718,422	0	2,734,172	313,856	
20,496,305	合計	14,557,215	0	7,865,606	570,683	

(様式2D)

釜石市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28															
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(箱 崎白浜地区)	箱崎白浜	市	市	直接	継続	536,110	24	~	28	23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。
																	24	69,750	9,441	-	25年3月用地等調査業務委託発注。
																	25	81,375	3,489	-	25年12月測量設計業務委託発注。
																	26	40,687	165,668	-	26年7月舗装工事発注、8月~用地買収、補償契約
																	27	230,888	205,968	-	27年7月~用地買収、補償契約、10月~造成工事
																	28				
																	累計	422,700	0	384,566	0
3	D	-	1	-	2	-	道路事業(両 石地区)	両石	市	市	直接	廃止	330,000	24	~	27	23	0	0	0	
																	24	93,000	0	-	
																	25	108,500	8,696	-	26年2月測量調査設計業務委託発注。
																	26	54,250	▲ 1,543	-	26年9月設計業務契約変更
																	27	0	0	248,597	
																	28				
																	累計	255,750	0	7,153	248,597
4	D	-	1	-	3	-	道路事業(本 郷地区)	本郷	市	市	直接	廃止	30,000	24	~	24	23	0	0	0	
																	24	23,250	0	23,250	
																	25	0	0	0	
																	26	0	0	0	
																	27	0	0	0	
																	28				
																	累計	23,250	0	0	23,250
5	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅建設事業 (上中島町)	上中島町	市	市	直接	完了	6,261,509	24	~	27	23	0	0	0	25年3月土地売買契約締結。
																	24	4,805,360	1,034,836	-	25年3月建物売買契約締結。54戸
																	25	0	4,077,142	-	25年12月建物譲渡契約締結(譲渡契約はH26年度予定)
																	26	673,460	206,514	0	27年2月譲渡確定契約により住宅取得
																	27	0	134,157	26,171	28年3月土地売買契約締結
																	28				
																	累計	5,478,820	0	5,452,649	26,171
6	D	-	4	-	2	-	災害復興公営 住宅建設事業 (尾崎・佐須)	尾崎・佐 須	市	市	直接	完了	272,690	24	~	27	23	0	0	0	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
																	24	187,556	4,572	-	24年11月工事設計業務委託発注。6戸
																	25	0	75,347	-	25年12月旧施設解体工事発注
																	26	51,047	104,627	-	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。
																	27	0	▲ 4	54,061	26年度繰越額を重複していたため調整
																	28				
																	累計	238,603	0	184,542	54,061
7	D	-	4	-	3	-	災害復興公営 住宅建設事業 (箱崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	完了	348,489	24	~	26	23	0	0	0	24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
																	24	129,526	78,494	-	24年11月工事設計業務委託発注。11戸
																	25	0	175,401	203,085	25年8月住宅建設工事発注。事業間流用あり
																	26	0	1,179	0	26年8月転落防止柵工事発注。
																	27	0	0	22,169	
																	28				
																	累計	129,526	175,401	282,758	22,169

8	D	-	4	-	4	-	災害復興公営住宅建設事業(花露辺)	花露辺	市	市	直接	完了	495,236	24	~	25	23	0	0	0	24年4月7月住宅候補地補償算定業務発注。13戸	
																	24	241,926		62,249		
																	25	147,311	44,092	371,080	0	25年12月建物譲渡契約締結。事業間流用あり
																	26	0		0		
																	27	0		0		
																	28	0		0		
累計	389,237	44,092	433,329	0																		
9	D	-	4	-	5	-	災害復興公営住宅建設事業(大石)	大石	市	市	直接	完了	73,204	24	~	25	23	0	0	0	24年11月工事設計業務委託発注。3戸	
																	24	52,878		3,704		
																	25	0	11,175	60,354	0	25年7月住宅建設工事発注。事業間流用あり
																	26	0		0		
																	27	0		▲ 5		
																	28	0		0		
累計	52,878	11,175	64,053	0																		
10	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点整備事業(鵜住居地区)	鵜住居	市	市	直接	継続	1,857,785	24	~	28	23	0	0	0	24年5月測量調査設計業務,6月同業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務発注。	
																	24	915,781		516,920	-	25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。
																	25	0		66,679	-	26年5月~用地買収、9月URとの協定変更(~H29.3)
																	26	477,557		271,447	-	協定事業費内訳変更(~H29.3)
																	27	0		0		
																	28	0		0		
累計	1,393,338	0	855,046	0																		
11	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点整備事業(東部地区)	東部	市	市	直接	継続	14,029,596	24	~	30	23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,5月釜石市土地開発公社に先行取得依頼,6月同業務委託,25年3月不動産価格鑑定評価業務を発注	
																	24	1,010,328		739,519	-	
																	25	2,119,278		856,820	-	H25.5月,H26.2月調査測量設計業務,H26.1月分筆等業務,H26.3月緑地整備工事を発注。
																	26	4,298,195		2,665,376	-	26年4月~用地買収、7月~補償契約、設計変更契約
																	27	1,027,244		5,403,018	-	27年4月~用地買収、補償契約、7月~造成工事(複数年契約)
																	28	1,652,196		0		
累計	10,107,241	0	9,664,733	0																		
12	D	-	17	-	1	-	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	片岸	市	市	直接	完了	179,672	24	~	25	23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評価業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務,3月不動産価格鑑定評価業務を発注	
																	24	256,331		134,754		
																	25	0	▲ 121,577	▲ 28,897	28,897	25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり
																	26	0		0		
																	27	0		0		
																	28	0		0		
累計	256,331	▲ 121,577	105,857	28,897																		
13	D	-	17	-	2	-	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	鵜住居	市	市	直接	完了	307,418	24	~	25	23	0	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評価業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量・補償調査業務を発注。	
																	24	386,433		230,563		
																	25	0	▲ 155,870	▲ 75,915	75,915	25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり
																	26	0		0		
																	27	0		0		
																	28	0		0		
累計	386,433	▲ 155,870	154,648	75,915																		
14	D	-	17	-	3	-	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	東部	市	市	直接	完了	102,945	24	~	24	23	0	0	0	24年7月不動産価格鑑定評価業務発注。	
																	24	77,208		266	76,942	
																	25	0		0		
																	26	0		0		
																	27	0		0		
																	28	0		0		
累計	77,208	0	266	76,942																		

15	D	-	17	-	4	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	嬉石松原	市	市	直接	完了	163,689	24	~	25	23	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月測量調査設計業務,7月不動産 価格鑑定評価業務,H25.1月付帯設計業務,3月測量調査設計業 務を発注。 事業間流用あり
																	24	129,832	122,765	
																	25	0	▲ 7,066	
																	26	0	0	
																	27	0	0	
																	28	0	0	
累計	129,832	▲ 7,066	122,765	1																
16	D	-	17	-	5	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	平田	市	市	直接	完了	202,300	24	~	25	23	0	0	H24.5月測量調査設計業務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年 1月付帯設計業務,3月測量調査設計業務を発注。 事業間流用あり
																	24	203,340	151,724	
																	25	0	▲ 51,615	
																	26	0	0	
																	27	0	0	
																	28	0	0	
累計	203,340	▲ 51,615	151,724	1																
17	D	-	20	-	1	-	釜石市東部地 区他都市防災 推進事業(都 市防災総合推 進事業)	東部地区 他	市	市	直接	継続	77,500	24	~	28	23	0	0	25年2月調査業務委託発注。 25年9月業務委託発注。(26年3月設計業務完了) 27年3月津波予測計算委託発注
																	24	33,375	9,024	
																	25	24,750	21,456	
																	26	0	2,915	
																	27	0	0	
																	28	0	0	
累計	58,125	0	33,395	0																
18	D	-	21	-	1	-	釜石東部市街 地污水管路整 備事業	東部等	市	市	直接	継続	850,000	24	~	29	23	0	0	24年7月設計業務委託発注。 業務委託、25年11月、工事発注 27年4月、工事発注
																	24	37,500	23,316	
																	25	300,000	90,483	
																	26	0	8,076	
																	27	135,000	255,330	
																	28	0	0	
累計	472,500	0	377,205	0																
19	D	-	21	-	2	-	釜石東部市街 地雨水管路整 備事業	東部等	市	市	直接	継続	615,000	24	~	29	23	0	0	24年7月設計業務委託発注。 26年2月業務委託発注 26年6月、工事発注 27年6月、工事発注
																	24	11,250	4,467	
																	25	135,000	18,954	
																	26	0	70,205	
																	27	210,000	206,435	
																	28	0	0	
累計	356,250	0	300,061	0																
20	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (片岸)(調査 等)	片岸	市	市	直接	継続	39,550	24	~	28	23	0	0	24年10月測量調査設計業務委託発注。
																	24	29,662	6,516	
																	25	0	0	
																	26	0	0	
																	27	0	0	
																	28	0	0	
累計	29,662	0	6,516	0																
21	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (片岸)(用地)	片岸	市	市	直接	未着手	420,000	24	~	28	23	0	0	
																	24	280,000	0	
																	25	0	0	
																	26	0	0	
																	27	0	0	
																	28	0	0	
累計	280,000	0	0	0																
22	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (水海)(調査 等)	水海	市	市	直接	継続	460,778	24	~	28	23	0	0	24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評 価業務発注。 25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。 26年9月不動産価格鑑定評価業務発注。 27年10月設計業務委託
																	24	9,885	8,876	
																	25	0	3	
																	26	0	2	
																	27	27,823	18,824	
																	28	0	0	
累計	37,708	0	27,705	0																

23	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (水海)(用地)	水海	市	市	直接	未着手	340,000	24	~	28	23	0	0				
																	24	72,000	0	-			
																	25	0	0	-			
																	26	0	0	-			
																	27	0	0	-			
																	28	0	0	-			
累計	72,000	0	0																				
24	D	-	22	-	5	-	都市公園事業 (東部)(調査等)	東部	市	市	直接	完了	10,730	24	~	25	23	0	0	H24.5月測量調査設計業務,6月測量調査設計業務,25年3月測量調査設計業務,不動産価格鑑定評価業務の発注。			
																	24	8,047	7,782				
																	25	0	▲ 1,470		1,735		
																	26	0	0		0		
																	27	0	0				
																	28	0	0				
累計	8,047	0	6,312	1,735																			
25	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(花 露辺地区)	花露辺	市	市	直接	継続	124,300	24	~	28	23	0	0	24年7月実施設計業務委託発注。 25年1月~用地買収。 25年4月~用地買収。6月不動産価格鑑定評価業務,5月住宅団 地造成業務,7月配水管布設工事を発注。 26年7月用地買収、9月補助金交付決定			
																	24	103,950	12,800				
																	25	4,812	85,612				
																	26	0	1,824				
																	27	0	0				
																	28	0	0				
累計	108,762	0	100,236	0																			
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画等策定 事業)	13地区	市	市	直接	継続	776,475	23	~	28	23	14,655	10,226	24年3月花露辺測量調査設計業務,5月各地区測量調査設計業 務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年1月画地評価格算定業 務,2月花露辺登記申請書類作成業務,3月各地区用地等調査業 務,画地評価格算定業務,不動産価格鑑定評価の発注。10月岩 手県土地開発公社と実施協定締結。 25年5月~不動産鑑定評価業務,7月画地評価格算定業務,9月 測量調査設計・地籍測量図作成業務,10月文化財調査・用地測 量業務,26年1月測量調査業務委託,26年3月用地測量業務委託 を発注 26年6月~用地測量業務発注 27年5月~測量調査設計委託、6月~文化財発掘調査、9月~ 不動産鑑定			
																	24	567,701	346,029				
																	25	0	130,838				
																	26	0	4,663				
																	27	0	74,186				
																	28	0	0				
累計	582,356	0	565,942	0																			
29	◆	D	-	4	-	2	-	1	スマートコミュ ニティ推進事 業	箱崎、天 神、花露 辺、東部	市	市	直接	完了	10,000	24	~	24	23	0	0	24年8月業務委託発注。	
																			24	8,000	7,988		12
																			25	0	0		
																			26	0	0		
																			27	0	0		
																			28	0	0		
累計	8,000	0	7,988	12																			
30	◆	D	-	4	-	2	-	2	地域コミュ ニティバス導 入等公共交 通網再整備 事業	鶴住居	市	市	直接	完了	29,600	24	~	24	23	0	0	24年10月業務委託発注。	
																			24	23,680	12,343		11,337
																			25	0	0		
																			26	0	0		
																			27	0	0		
																			28	0	0		
累計	23,680	0	12,343	11,337																			
31	◆	D	-	20	-	1	-	1	法面改修事業	甲子	市	市	直接	完了	176,000	24	~	26	23	0	0	25年3月設計業務委託発注。 27年3月完了	
																			24	140,800	2,604		
																			25	0	0		
																			26	0	23,119		115,077
																			27	0	0		
																			28	0	0		
累計	140,800	0	25,723	115,077																			

41	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	平田の2	県	県	直接	廃止	330,000	24	~	27	23	0			市で調整中	
																	24	24,750		0	-	
																	25	90,750		0	-	
																	26	156,750		0	272,250	
																	27	0				
																	累計	272,250	0	0	272,250	
42	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	下荒川の 2	県	県	直接	継続	305,000	24	~	28	23	0			25年5月用地買収開始、実施中	
																	24	24,750		18,150	-	
																	25	206,250		13,627	-	
																	26	20,625		131,868	-	
																	27	0		27,428	-	
																	累計	251,625	0	191,073	0	
43	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)吉里 吉里釜石 線 室浜	県	県	直接	継続	520,000	24	~	29	23	0			24年11月詳細設計発注、実施中	
																	24	24,750		7,425	-	
																	25	156,750		9,202	-	
																	26	74,250		65,126	-	
																	27	0		105,925	-	
																	累計	384,450	0	187,678	0	
44	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業	平田	県	県	直接	完了	3,120,400	23	~	25	23	315,350		9,979	-	24年1月、実施設計発注。
																	24	2,012,500		1,650,146	-	
																	25	402,500		39,589	1,030,636	
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	2,730,350	0	1,699,714	1,030,636	
45	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	野田	県	県	直接	完了	1,029,195	23	~	25	23	95,545		1,625	-	24年1月、実施設計発注。
																	24	704,375		425,085	-	
																	25	100,625		6,650	467,185	
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	900,545	0	433,360	467,185	
46	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	鶴住居・ 片岸	県	県	直接	継続	2,530,000	24	~	28	23	0		0		日向(30戸)設計終了
																	24	905,625		1,588	-	
																	25	1,308,125		47,846	-	
																	26	0		24,778	-	
																	27	0		1,840,203	-	
																	累計	2,213,750	0	1,914,415	0	
47	D	-	4	-	9	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	150,000	24	~	30	23	0				
																	24	65,625				
																	25	0		10,500	-	
																	26	0		0	-	
																	27	0		0	-	
																	累計	65,625	0	10,500	0	
48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	809,847	24	~	32	23	0				
																	24	15,828		0	-	
																	25	52,176		4,748	-	
																	26	0		41,347	-	
																	27	34,823		57,652	-	
																	累計	159,559	0	103,747	0	

49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内6ヶ 所	県	県	直接	継続	141,172	24	~	32	23	0				
																	24	2,430		0	-	
																	25	8,010		666	-	
																	26	0		6,189	-	入居60戸分
																	27	4,874		9,209	-	82戸入居
																	累計	23,772	0	16,064	0	
50	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	2,700	24	~	24	23	0				
																	24	2,160		0	-	
																	25	0		0	-	
																	26	0		0	-	2,160
																	27	0			-	
																	累計	2,160	0	0	2,160	
51	◆	D	-	1	-	1	復興関連道路 調査事業(改 築)	市内2路 線	県	県	直接	廃止	1,500	24	~	24	23	0				
																	24	1,200		0	-	
																	25	0		0	-	
																	26	0		0	-	1,200
																	27	0			-	
																	累計	1,200	0	0	1,200	
52	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	市内4路 線	県	県	直接	廃止	26,000	24	~	24	23	0				
																	24	20,800		0	-	
																	25	0		0	-	
																	26	0			-	20,800
																	27	0			-	
																	累計	20,800	0	0	20,800	
53	◆	D	-	4	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	継続	47,190	24	~	30	23	0				
																	24	28,800	▲ 264	0	-	
																	25	3,840		9,607	-	平田、野田分完成
																	26	0		0	-	
																	27	0		2,252	-	日向 完了、片岸・嬉石・松原 工事中
																	累計	32,640	▲ 264	11,859	0	
54	◆	D	-	4	-	1	県営住宅シス テム改修事業	市内8ヶ 所	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23	0				24年12月委託発注、平成25年3月完了
																	24	800	264	1,064	-	
																	25	0		0	-	
																	26	0		0	-	
																	27	0			-	
																	累計	800	264	1,064	0	
55	◆	D	-	4	-	1	既存建築物除 却事業	平田等	県	県	直接	完了	300,000	23	~	24	23	160,000		133,416		
																	24	80,000		50,026	56,558	
																	25	0		0	0	完成(H24.6契約~H24.11完成)
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	240,000	0	183,442	56,558	
58	D	-	1	-	7	-	道路事業(尾 崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	廃止	179,354	24	~	27	23	0				
																	24	74,059		0	-	
																	25	38,750		0	-	
																	26	26,190		0	-	
																	27	0			-	138,999
																	累計	138,999	0	0	138,999	

65	D	-	6	-	2	-	東日本大震災特別家賃低減事業	市内32ヶ所	市	市	直接	継続	503,529	24	~	32	23	0				
																	24	2,265		0		
																	25	8,520		0		
																	26	0		3,415		
																	27	21,687				
																	28	62,792				
累計	95,264	0	3,415	0																		
66	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(室浜)	室浜	市	市	直接	継続	1,402,900	24	~	28	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																	24	704,725		1,125,775		
																	25	390,250		0		
																	26	132,562		0		
																	27	0		▲ 779,799		H28.1公社事業完了
																	28					
累計	1,227,537	0	345,976	0																		
67	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業(根浜)	根浜	市	市	直接	継続	1,671,325	24	~	28	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																	24	291,012		402,174		
																	25	127,506		7,800		25年12月、26年3月用地買収。
																	26	80,500	963,389	0		
																	27	0		1,052,433		協定変更(~H29.3)
																	28					
累計	499,018	963,389	1,462,407	0																		
68	D	-	23	-	5	-	防災集団移転促進事業(箱崎)	箱崎	市	市	直接	継続	1,834,228	24	~	28	23	0				
																	24	1,001,826		0		
																	25	395,311		73,702		25年9月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。
																	26	207,812		575,717		26年6月~用地買収、9月設計変更契約、10月~造成工事発注、27年2月~補償契約
																	27	0		92,692		27年4月~用地買収、5月~補償契約、7月~設計業務委託、2年3月~造成工事
																	28					
累計	1,604,949	0	742,111	0																		
69	D	-	23	-	6	-	防災集団移転促進事業(箱崎白浜)	箱崎白浜	市	市	直接	継続	604,860	24	~	28	23	0				
																	24	324,940		0		
																	25	150,500		46,125		25年5月~用地買収。25年5月、26年2月測量調査設計業務委託発注。25年8月道路・水道整備工事発注。
																	26	53,812		237,435		26年4月~用地買収、7月舗装工事発注、9月~補償契約、設計変更契約
																	27	0		43,039		27年4月~補償契約、5月~用地買収、6月補助金交付決定、7月~設計業務委託、28年2月~造成工事
																	28					
累計	529,252	0	326,599	0																		
70	D	-	23	-	7	-	防災集団移転促進事業(桑ノ浜)	桑ノ浜	市	市	直接	継続	880,530	24	~	28	23	0			24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。	
																	24	242,917		312,900		
																	25	71,312		0		
																	26	69,125	202,576	226		26年8月用地買収
																	27	92,266		1,181		協定変更(~H29.3)、6月不動産鑑定
																	28	92,267				
累計	567,887	202,576	314,307	0																		
71	D	-	23	-	8	-	防災集団移転促進事業(尾崎白浜)	尾崎白浜	市	市	直接	継続	560,960	24	~	28	23	0				
																	24	286,090		0		
																	25	204,750		20,210		25年10月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注、物件移転補償。
																	26	0		115,567		26年4月~用地買収、補償契約、9月設計変更契約、12月造成工事発注
																	27	0		31,627		27年5月~補償契約、7月~設計業務委託、28年3月上水道工事
																	28					
累計	490,840	0	167,404	0																		

72	D	-	23	-	9	-	防災集団移転促進事業(本郷)	本郷	市	市	直接	継続	526,720	24	~	28	23	0			25年9月~用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年4月~用地買収、9月設計変更契約、補償契約、12月造成工事発注 27年6月~用地買収、7月~設計業務委託、10月~造成工事			
																	24	306,005		0				
																	25	116,375		172,868				
																	26	38,500		243,979				
																	27	0		24,830				
																	累計	460,880	0	441,677		0		
73	D	-	23	-	10	-	防災集団移転促進事業(唐丹片岸)	唐丹片岸	市	市	直接	継続	654,040	24	~	28	23	0			25年11月~用地買収。 26年4月用地買収、補償契約			
																	24	433,160		0				
																	25	139,125		165,546				
																	26	0		38,392				
																	27	0		0				
																	累計	572,285	0	203,938		0		
74	D	-	23	-	11	-	防災集団移転促進事業(荒川)	荒川	市	市	直接	継続	604,960	24	~	28	23	0			25年11月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。 26年4月~用地買収、7月~補償契約、9月設計変更契約、10月~造成工事発注 27年4月~用地買収、補償契約、7月~設計業務委託、28年2月上水道工事			
																	24	317,590		0				
																	25	169,750		45,990				
																	26	42,000		92,028				
																	27	0		124,461				
																	累計	529,340	0	262,479		0		
78	◆	D	-	4	-	1	-	5	災害復興公営住宅駐車場整備事業	市内18ヶ所	市	市	直接	継続	118,767	24	~	28	23	0			25年12月駐車場整備工事発注 復興住宅買取事業に伴い事業費按分	
																			24	9,637		0		
																			25	9,878		5,201		
																			26	34,717		0		
																			27	0		2,560		
																			累計	54,232	0	7,761		0
79	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害時発電機整備事業	東部	市	市	直接	完了	20,539	24	~	24	23	0			24年8月設計管理業務委託発注。 24年11月工事発注。	
																			24	16,431		15,758		673
																			25	0		0		0
																			26	0		0		0
																			27	0		0		0
																			累計	16,431	0	15,758		673
80	◆	D	-	17	-	5	-	1	釜石・大槌地域産業再生支援事業	平田産業育成センター	市	市	直接	完了	280,000	24	~	24	23	0			24年9月工事発注。	
																			24	224,000		221,306		2,694
																			25	0		0		0
																			26	0		0		0
																			27	0		0		0
																			累計	224,000	0	221,306		2,694
81	◆	D	-	17	-	2	-	1	障がい者就労支援施設用地整備事業	鶉住居かまいしワークステーション	市	市	直接	完了	66,000	24	~	24	23	0			24年8月用地買収。	
																			24	52,800		50,977		1,823
																			25	0		0		0
																			26	0		0		0
																			27	0		0		0
																			累計	52,800	0	50,977		1,823

82	◆	D	-	17	-	4	-	1	復興事業用地確保(既存建築物除却)事業	八雲旧釜石第二中学校	市	市	直接	完了	159,533	24	~	25	23	0			24年11月工事(第1期)発注。⇒25年7月完了。	
																			24	64,000		41,076		0
																			25	63,626		52,234		34,316
																			26	0				
																			27	0				
																			28	0				
累計	127,626	0	93,310	34,316																				
83	◆	D	-	22	-	1	-	1	鶴住居地区スポーツ交流拠点創造ビジョン策定事業	鶴住居	市	市	直接	完了	43,000	24	~	24	23	0			24年11月業務委託発注。	
																			24	34,400		24,608		9,792
																			25	0				
																			26	0				
																			27	0				
																			28	0				
累計	34,400	0	24,608	9,792																				
84	◆	D	-	23	-	7	-	1	新墓地整備支援事業	桑ノ浜・室浜	市	市	直接	継続	21,000	24	~	28	23	0			26年3月室浜墓地完成。桑ノ浜は平成27年度以降に実施。 桑ノ浜は平成28年度以降に実施 桑ノ浜は平成28年度に予算措置、事業実施予定	
																			24	16,800		0		-
																			25	0		2,894		-
																			26	0		-		-
																			27	0				
																			28	0				
累計	16,800	0	2,894	0																				
86		D	-	1	-	9	-		まちづくり連携道路整備事業	荒川	県	県	直接	継続	300,000	24	~	30	23	0			25年5月用地買収開始、実施中 25年5月用地買収開始、25年8月完了 26年12月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中	
																			24	16,500		16,554		-
																			25	82,500		17,173		-
																			26	107,250		16,595		-
																			27	0		52,650		-
																			28	0				
累計	206,250	0	102,972	0																				
88	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	釜石市	市	市	直接	継続	17,513,046	24	~	32	23	0				
																			24	3,870,934		78,845		-
																			25	1,056,117		3,812,684		-
																			26	1,468,781		2,605,137		-
																			27	7,148,413		1,559,601		-
																			28	466,184				
累計	14,010,429	0	8,056,267	0																				
92		D	-	1	-	10	-		道路事業(東部)	東部	市	市	直接	継続	1,817,610	24	~	28	23	0			24年12月港町2号線概略設計業務委託発注。 25年2月港町2号線測量調査設計業務委託発注。 25年2月港町2号線道路整備(その1)工事発注。 26年1月港町2号線道路整備(その2)工事発注。 27年10月港町2号線道路整備(その1)・(その2)工事 変更契約	
																			24	49,693		46,649		-
																			25	258,567		557,442		-
																			26	1,007,622		457,644		-
																			27	103,530		322,562		-
																			28	0				
累計	1,419,412	0	1,384,297	0																				
93		D	-	4	-	14	-		災害復興公営住宅建設事業(本郷)	本郷	市	市	直接	継続	787,254	24	~	28	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。15戸 事業間流用あり 26年12月造成工事発注。	
																			24	230,370		27,277		-
																			25	645,054	▲ 186,576	0		-
																			26	0		29,304		-
																			27	0		173,110		-
																			28	0				
累計	875,424	▲ 186,576	229,691	0																				
94		D	-	4	-	15	-		災害復興公営住宅建設事業(小白浜)	小白浜	市	市	直接	完了	1,283,997	24	~	27	23	0			25年1月土地面地評価格算定業務委託発注。 25年3月測量調査業務委託発注。40戸 用地売買契約締結 27年1月譲渡契約(確定契約はH27.8予定) 事業費按分による調整	
																			24	369,250		17,727		-
																			25	754,247		101,253		-
																			26	0		707,261		-
																			27	0		▲ 32,020		329,276
																			28	0				
累計	1,123,497	0	794,221	329,276																				

95	D	-	4	-	16	-	災害復興公営住宅建設事業(片岸(唐丹))	片岸(唐丹)	市	市	直接	完了	335,870	24	~	26	23	0			24年11月工事設計業務委託発注。10戸	
																	24	176,575		7,316		
																	25	117,311		7,530	用地売買契約締結	
																	26	0		78,739	200,301	26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。
																	27	0				
																	累計	293,886	0	93,585	200,301	
96	D	-	4	-	17	-	災害復興公営住宅建設事業(片岸)	片岸	市	市	直接	継続	1,822,677	24	~	28	23	0			24年11月設計業務委託発注。80戸	
																	24	87,500		54,469	-	
																	25	1,507,342		95,552	-	用地売買契約締結
																	26	0		15,147	-	26年12月URと実務業務委託契約。
																	27	0				
																	累計	1,594,842	0	165,168	0	
97	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(かけ地近接等危険住宅移転事業)	嬉石等	市	市	直接	継続	832,512	24	~	30	23	0				
																	24	19,488		0	-	
																	25	604,896		42,975	-	
																	26	0		107,139	-	
																	27	0		22,126	-	
																	累計	624,384	0	172,240	0	
98	D	-	17	-	6	-	都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23	0				
																	24	182,580		0	0	
																	25	0	▲ 182,580	0	0	D-17-10へ事業間流用
																	26	0		0		
																	27	0				
																	累計	182,580	▲ 182,580	0	0	
99	D	-	17	-	7	-	都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業)(鶴住居)	鶴住居	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23	0				
																	24	412,539		0	0	
																	25	0	▲ 412,539	0	0	D-17-11へ事業間流用
																	26	0		0		
																	27	0				
																	累計	412,539	▲ 412,539	0	0	
100	D	-	17	-	8	-	都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業)(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23	0				
																	24	158,816		0	0	
																	25	0	▲ 158,816	0	0	D-17-12へ事業間流用
																	26	0		0		
																	27	0				
																	累計	158,816	▲ 158,816	0	0	
101	D	-	17	-	9	-	都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業)(平田)	平田	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23	0				
																	24	227,743		0	0	
																	25	0	▲ 227,743	0	0	D-17-13へ事業間流用
																	26	0		0		
																	27	0				
																	累計	227,743	▲ 227,743	0	0	
102	D	-	21	-	3	-	雨水ポンプ施設建設事業	東部等	市	市	直接	継続	4,955,970	24	~	30	23	0			24年12月設計業務委託発注。	
																	24	7,500		3,386	-	
																	25	37,500		36,450	-	26年3月工事発注
																	26	26,250		13,493	-	26年6月、設計業務委託発注
																	27	165,000		124,196	-	
																	累計	493,305	0	177,525	0	

103	D	-	23	-	12	-	防災集団移転促進事業(両石)	両石	市	市	直接	継続	3,557,100	24	~	28	23	0			25年8月~用地買収。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場整備工事発注。 26年4月~用地買収、6月~補償契約、9月設計変更契約、10月~造成工事発注 27年4月~用地買収、補償契約、7月~設計業務委託、11月~造成工事(複数年契約)	
																	24	1,380,400		0		
																	25	1,316,437		193,796		
																	26	0		2,169,498		
																	27	0		155,305		
																	28	0		0		
累計	2,696,837	0	2,518,599	0																		
104	D	-	23	-	13	-	防災集団移転促進事業(小白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	1,573,788	24	~	28	23	0			25年8月測量調査設計業務委託発注。10月~用地買収。 26年4月~不動産鑑定業務発注、5月~用地買収、6月~補償契約、10月~造成工事発注 27年5月~用地買収、7月~設計業務委託、補償契約。8月~造成工事(複数年契約)	
																	24	1,431,342		0		
																	25	1,111,687		122,625		
																	26	0	▲ 1,165,965	312,252		
																	27	0		261,596		
																	28	0		0		
累計	2,543,029	▲ 1,165,965	696,473	0																		
106	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携道路整備事業	(一)吉里吉里釜石線 室浜の2	県	県	直接	継続	2,450,000	24	~	29	23	0			24年10月詳細設計発注、実施中 25年6月用地測量発注、実施中 26年10月に工事発注、実施中 26年度に引続き工事を実施中	
																	24	49,500		49,500		
																	25	49,500		22,034		
																	26	618,750		211,689		
																	27	660,000		847,934		
																	28	297,000		0		
累計	1,674,750	0	1,131,157	0																		
107	◆	D	-	4	-	6	-	住宅再建相談会	釜石市内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	23	0			平成25年度11回開催+住まいの展示会 平成26年度18回開催+住まいの展示会
																		24	1,200		247	
																		25	1,200		1,178	
																		26	0		975	
																		27	0		0	
																		28	0		0	
累計	2,400	0	2,400	0																		
114	D	-	1	-	12	-	道路事業(小白浜)	小白浜	市	市	直接	継続	581,013	24	~	29	23	0			25年9月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。26年2月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。 26年9月【線】唐丹20号線道路改良用地調査業務委託発注。10月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。12月唐丹20号線道路改良物件調査業務委託発注、物件移転補償開始。 27年6月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。9月物件調査業務委託発注、28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐丹20号線道路改良工事(その1)(その2)発注。用地買収、物件補償継続	
																	24	13,221		0		
																	25	121,264		16,570		
																	26	0		28,361		
																	27	177,532		138,502		
																	28	0		0		
累計	312,017	0	183,433	0																		
115	D	-	4	-	18	-	災害復興公営住宅建設事業(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	継続	1,807,064	25	~	28	23	0			用地売買契約締結 用地売買契約締結 建設は県事業。用地買収のみで完了	
																	24	0		0		
																	25	1,581,181		109,801		
																	26	0		3,665		
																	27	0		0		
																	28	0		0		
累計	1,581,181	0	113,466	0																		

116	D	-	4	-	19	-	災害復興公営住宅建設事業(荒川)	荒川	市	市	直接	継続	654,138	25	~	28	23	0				基本計画完了。事業間流用あり。 26年12月造成工事発注。 28年3月買取確定契約
																	24	0		0		
																	25	616,462	▲ 44,092	3,288		
																	26	0		20,280		
																	27	0		121,948		
																	累計	616,462	▲ 44,092	145,516	0	
117	D	-	4	-	20	-	災害復興公営住宅建設事業(仮宿)	仮宿	市	市	直接	廃止	40,668	25	~	25	23	0				入居希望者なしのため、整備計画を変更
																	24	0		0		
																	25	35,584		0	35,584	
																	26	0		0		
																	27	0		0		
																	累計	35,584	0	0	35,584	
118	D	-	9	-	1	-	小規模住宅地区改良事業(鶉住居)	鶉住居	市	市	直接	未着手	115,000	25	~	28	23	0				
																	24	0		0		
																	25	76,666		0		
																	26	0		0		
																	27	0		0		
																	累計	76,666	0	0	0	
119	D	-	9	-	2	-	小規模住宅地区改良事業(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	完了	45,000	25	~	26	23	0				27年2月補償契約
																	24	0		0		
																	25	30,000		0		
																	26	0		29,999	1	
																	27	0		0		
																	累計	30,000	0	29,999	1	
120	D	-	9	-	3	-	小規模住宅地区改良事業(平田)	平田	市	市	直接	継続	71,000	25	~	28	23	0				27年6月補償契約
																	24	0		0		
																	25	47,333		0		
																	26	0		0		
																	27	0		18,146		
																	累計	47,333	0	18,146	0	
121	D	-	17	-	10	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地地区画整理事業)(片岸)	片岸	市	市	直接	継続	2,614,981	25	~	30	23	0				H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3) 25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。10月、11月文化財調査委託発注。11月~用地買収。 27年3月URとの協定変更(~H28.3) 27年5月~補償契約、協定事業費内訳変更(~H29.3)
																	24	0		1,208,325		
																	25	395,250	304,157	174,893		
																	26	777,508		340,281		
																	27	484,319		127,493		
																	累計	1,657,077	304,157	1,850,992	0	
122	D	-	17	-	11	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地地区画整理事業)(鶉住居)	鶉住居	市	市	直接	継続	9,068,368	24	~	30	23	0				H25年3月 URとの業務委託協定を締結(期間:H25.4~H28.3) 25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。9月~不動産価格鑑定評価業務発注。11月文化財調査委託発注。26年1月~用地買収。 26年4月~用地買収、10月~補償契約、27年3月URとの協定変更(~H28.3) 27年4月~補償契約、協定事業費内訳変更(~H29.3)
																	24	0		3,921,150		
																	25	1,352,175	568,409	704,971		
																	26	3,040,835		1,930,857		
																	27	1,839,855		223,281		
																	累計	6,232,865	568,409	6,780,259	0	

123	D	-	17	-	12	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地地区画整理 事業)(嬉石松 原)	嬉石松原	市	市	直接	継続	4,878,687	25	~	30	23	0			25年9月~用地買収、不動産価格鑑定評価業務発注。12月~ 物件移転補償。26年2月仮置場整備工事発注。 26年4月~補償契約、7月~設計業務発注、10月~造成工事発 注		
																	24	0		0			
																	25	695,932	165,882	280,965			
																	26	1,872,265		2,260,184			
																	27	924,933		32,884		27年4月~補償契約、6月~設計業務委託、10月~造成工事	
28	累計	3,493,130	165,882	2,574,033	0																		
124	D	-	17	-	13	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地地区画整理 事業)(平田)	平田	市	市	直接	継続	7,297,919	25	~	30	23	0			25年6月~用地買収。9月不動産価格鑑定評価業務発注。12月~ 物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場整 備工事発注。 26年4月~補償契約、6月~建物調査発注、11月~造成工事発 注		
																	24	0		0			
																	25	1,176,000	279,358	526,427			
																	26	1,833,443		1,022,217			
																	27	2,184,636		1,263,671		27年4月~補償契約、10月~造成工事	
28	累計	5,194,079	279,358	2,812,315	0																		
125	◆	D	-	4	-	10	2	法面改修事業	天神	市	市	直接	完了	71,264	25	~	27	23	0			設計業務委託発注 26年11月工事発注 28年2月工事竣工・引渡	
																		24	0		0		
																		25	45,312		7,576		
																		26	11,699		43,326		
																		27	0		4,108		2,001
28	累計	57,011	0	55,010	2,001																		
126	D	-	21	-	4	-	鵜住居地区公 共下水道事業	鵜住居・ 片岸	市	市	直接	継続	3,300,000	25	~	29	23	0			25年12月設計業務委託、26年3月実施設計発注 26年6月 用地取得		
																	24	0		0			
																	25	315,000		69,904			
																	26	0		113,468			
																	27	0					
28	累計	315,000	0	183,372	0																		
127	D	-	21	-	5	-	平田地区公共 下水道事業	平田	市	市	直接	継続	230,000	25	~	29	23	0			25年12月設計業務委託発注		
																	24	0		0			
																	25	71,250		15,714			
																	26	0		0			
																	27	90,000		96,260			
28	累計	161,250	0	111,974	0																		
131	D	-	4	-	21	-	災害復興公営 住宅建設事業	東部(中 心部)	市	市	直接	継続	11,620,576	25	~	28	23	0			用地売買契約締結 用地売買契約締結 基本協定締結(12団地)		
																	24	0		0			
																	25	1,713,303		177,559			
																	26	6,280,331		95,561			
																	27	0		7,695,332			
28	累計	7,993,634	0	7,968,452	0																		
132	D	-	4	-	22	-	災害復興公営 住宅建設事業	桑ノ浜	市	市	直接	継続	369,815	25	~	28	23	0			基本計画完了 27年3月造成工事発注。 基本協定締結		
																	24	0		0			
																	25	198,878		4,584			
																	26	66,809		41,380			
																	27	0		184,275			
28	累計	265,687	0	230,239	0																		

133	D	-	4	-	23	-	災害復興公営住宅建設事業	両石	市	市	直接	継続	1,908,186	25	~	29	23	0									
																	24	0		0							
																	25	329,498		7,734		基本計画完了					
																	26	1,340,164		0							
																	27	0		184,275		基本協定締結					
																	累計	1,669,662	0	192,009	0						
134	D	-	4	-	24	-	災害復興公営住宅建設事業	鶉住居(中心部)	市	市	直接	継続	3,362,544	25	~	28	23	0									
																	24	0		0							
																	25	840,623		177,559		基本計画完了					
																	26	2,101,603		214,039		用地売買契約締結。26年12月UR実務業務契約。					
																	27	0		2,308,040		概算契約締結					
																	累計	2,942,226	0	2,699,638	0						
135	◆	D	-	15	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																						23	0				
																						24	0		0		
																						25	443,328		443,328	0	25年8月建築工事発注。26年3月完成。
																						26	0		0		
																						累計	443,328	0	443,328	0	
136	D	-	1	-	13	-	まちづくり連携道路整備事業	(国)283号松原	県	県	直接	継続	305,000	24	~	28	23	0									
																	24	0		0							
																	25	74,250		31,845		25年10月工事発注、工事实施中					
																	26	173,250		90,941		25年度に引き続き、工事实施中					
																	27	4,125		42,892		26年度に引続き工事を実施中					
																	累計	251,625	0	165,678	0						
141	★	F	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																						23	0				
																						24	0		0		
																						25	432,304		39,976		
																						26	0		112,229		
																						累計	432,304	0	318,850	0	
142	◆	D	-	17	-	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																						23	0				
																						24	0		0		
																						25	334,400		0		
																						26	1,138,267		2,450,341		27年3月URとの協定変更契約(~H28.3)
																						累計	2,450,341	0	2,450,341	0	協定事業費内訳変更(~H29.3)
143	D	-	1	-	14	-	まちづくり連携道路整備事業	(主)釜石遠野鶉住居	県	県	直接	廃止	50,000	25	~	27	23	0									
																	24	0		0							
																	25	33,000		0		区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調整中					
																	26	8,250		0	41,250						
																	27	0		0							
																	累計	41,250	0	0	41,250						
145	D	-	21	-	6	-	鶉住居地区公共下水道事業(処理場)	鶉住居・片岸	市	市	直接	継続	1,500,000	26	~	28	23	0									
																	24	0		0							
																	25	0		0							
																	26	1,162,500		1,162,500		26年7月 発注					
																	27	0		0							
																	累計	1,162,500	0	1,162,500	0						

146	◆	D	-	1	-	10	-	1	不発弾探査事業(東部)	東部	市	市	直接	継続	208,930	26	~	28	23	0				
																			24	0		0		
																			25	0		0		
																			26	156,234		21,888		
																			27	10,909		139,755		
																			28					
累計	167,143	0	161,643	0																				
26年4月港町2号線道路整備工事発注 H27年3月 不発弾探査完了																								
147	◆	D	-	15	-	2	-	2	東部地区排水施設整備事業	東部等	市	市	直接	継続	700,000	26	~	29	23	0				
																			24	0		0		
																			25	0		0		
																			26	200,000		163,604		
																			27	240,000		161,346		
																			28					
累計	440,000	0	324,950	0																				
148	◆	D	-	17	-	11	-	1	鵜住居地区復興広場整備事業	鵜住居	市	市	直接	継続	1,654,500	26	~	28	23	0				
																			24	0		0		
																			25	0		0		
																			26	45,324		194		
																			27	164,458		351,162		
																			28	1,113,816				
累計	1,323,598	0	351,356	0																				
土地鑑定評価業務のみ実施 27年5月 測量調査設計発注。27年10月 造成工事発注。28年完成予定。28年3月 釜石市土地開発基金から用地購入。																								
149	◆	D	-	17	-	11	-	2	仮置場整備事業	水海・平田	市	市	直接	継続	2,274,883	26	~	28	23	0				
																			24	0		0		
																			25	0		0		
																			26	487,065		450,633		
																			27	1,332,840		844,520		
																			28					
累計	1,819,905	0	1,295,153	0																				
26年7月~仮置場整備工事発注 27年5月~仮置場整備工事(複数年契約)																								
150	◆	D	-	17	-	11	-	3	鵜住居地区排水施設整備事業	鵜住居・片岸	市	市	直接	継続	2,950,000	26	~	29	23	0				
																			24	0		0		
																			25	0		0		
																			26	406,400		406,323		
																			27	884,800				
																			28					
累計	1,291,200	0	406,323	0																				
26年8月 委託																								
151	◆	D	-	17	-	13	-	1	平田地区排水施設整備事業	平田	市	市	直接	継続	707,000	26	~	29	23	0				
																			24	0		0		
																			25	0		0		
																			26	145,600		893		
																			27	160,000		98,842		
																			28					
累計	305,600	0	99,735	0																				
27年10月 工事発注																								
152	◆	D	-	17	-	10	-	2	片岸町雨水排水路整備事業	片岸	市	市	直接	継続	204,800	26	~	30	23	0				
																			24	0		0		
																			25	0		0		
																			26	163,840		0		
																			27			5,077		
																			28					
累計	163,840	0	5,077	0																				
27年8月片岸地区雨水排水路予備設計業務委託発注。27年12月JR山田線排水路線下横断工事設計業務委託発注。																								
153	◆	D	-	17	-	10	-	3	消防水利整備事業(片岸)	片岸	市	市	直接	継続	31,200	26	~	28	23	0				
																			24	0		0		
																			25	0		0		
																			26	21,600		24,960		
																			27	3,360		0		
																			28					
累計	24,960	0	24,960	0																				
27年3月URとの協定変更契約(~H28.3) 協定事業費内訳変更(~H29.3)																								

154	◆	D	-	17	-	11	-	4	消防水利整備事業(鶴住居)	鶴住居	市	市	直接	継続	36,600	26	~	28	23					-	27年3月URとの協定変更契約(~H28.3) 協定事業費内訳変更(~H29.3)
																			24						
																			25						
																			26	21,600		29,280			
																			27	7,680		0			
28																									
累計	29,280	0	29,280	0																					
155	◆	D	-	17	-	12	-	1	消防水利整備事業(嬉石松原)	嬉石松原	市	市	直接	未着手	20,400	26	~	28	23					-	
																			24						
																			25						
																			26	14,400		0			
																			27	1,920					
28																									
累計	16,320	0	0	0																					
156	◆	D	-	17	-	13	-	2	消防水利整備事業(平田)	平田	市	市	直接	未着手	23,400	26	~	28	23					-	
																			24						
																			25						
																			26	14,400		0			
																			27	4,320					
28																									
累計	18,720	0	0	0																					
158		D	-	1	-	15	-		道路事業(箱崎)	箱崎	市	市	直接	継続	1,201,615	26	~	28	23					-	27年1月道路新設工事発注(複数年契約)、2月~用地買収、補償契約 27年7月~補償契約、8月~用地買収、12月~道路新設工事(複数年契約)
																			24						
																			25						
																			26	307,026		451,838			
																			27	567,202		426,274			
28	87,062																								
累計	961,290	0	878,112	0																					
159	◆	D	-	15	-	2	-	3	不発弾探査事業(東部地区)	東部	市	市	直接	継続	767,880	26	~	28	23					-	27年8月~調査業務委託
																			24						
																			25						
																			26	614,304		0			
																			27			263,725			
28																									
累計	614,304	0	263,725	0																					
160	◆	D	-	17	-	11	-	5	JR山田線踏切移設事業	鶴住居	市	市	直接	継続	71,500	26	~	28	23					-	27年3月URとの協定変更(~H28.3) 協定事業費内訳変更(~H29.3)
																			24						
																			25						
																			26	5,200		57,200			
																			27	52,000		0			
28																									
累計	57,200	0	57,200	0																					
161	◆	D	-	17	-	12	-	2	不発弾探査事業(嬉石松原地区)	嬉石松原	市	市	直接	継続	578,880	26	~	28	23					-	26年12月調査委託業務発注 27年6月~調査業務委託
																			24						
																			25						
																			26	463,104		179,280			
																			27			34,995			
28																									
累計	463,104	0	214,275	0																					
162		D	-	4	-	25	-		災害公営住宅整備事業	嬉石松原	県	県	直接	継続	4,048,661	26	~	28	23					-	H27.1設計発注(H27完了) - 工事中
																			24						
																			25						
																			26	429,716		461,046			
																			27	643,187		243,117			
28	2,469,674																								
累計	3,542,577	0	704,163	0																					

163	D	-	4	-	26	-	災害公営住宅 整備事業	両石	県	県	直接	未着手	917,807	26	~	28	23						
																	24						
																	25						
																	26	88,193		0	-		
																	27						
																	28						
累計	88,193	0	0	0																			
164	◆	D	-	21	-	1	-	1	釜石東部市街 地污水管末端 管路整備事業	東部	市	市	直接	未着手	20,000	27	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	16,000			
																			28				
累計	16,000	0	0	0																			

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	570,895	0	145,020	0
		24	3,981,593	0	2,219,785	56,558
		25	3,001,780	0	254,641	1,497,821
		26	1,677,034	0	1,162,783	337,660
		27	1,347,009	0	3,395,907	0
		28	2,960,564	0	0	0
17,929,183	都道県交付分 計	13,538,875	0	7,178,136	1,892,039	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	14,655	0	10,226	0
		24	26,300,480	0	11,429,357	126,523
		25	22,937,201	0	14,622,347	176,449
		26	32,607,413	0	24,213,302	315,379
		27	20,618,163	0	26,510,894	821,274
		28	4,775,421	0	0	0
150,545,300	市町村交付分 計	107,253,333	0	76,786,126	1,439,625	
168,474,483	合計	120,792,208	0	83,964,262	3,331,664	

