かまいし復興レポートVol.47

釜石市

平成30年10月１日

目次

1 「かまいし復興レポート」について
2 復旧・復興の進捗状況
2-1 土地利用
2-2 住まい
2-3 インフラ
2-4 産業・雇用
2-5 教育
2-6 その他
2-7 完了項目
3 問い合わせ先

1 「かまいし復興レポート」について

❏目的

- 「市の復旧・復興がどこまで進んでいるか」という情報を提供し、共通認識を有することで、復旧・復興事業に関する円滑なコミュニケーションを推進する

❏公開方法

- 定期的に市ホームページ上に公開
- 今回（Vol.47）の数値は平成30年９月30日時点
- 括弧内は前回数値（平成30年７月31日時点）からの進捗を示す
- 事業進捗に合わせて指標項目の追加・変更を適宜行うものとする
  - 平成30年10月１日改定

2-1　土地利用(1)

各地区の主な事業種別

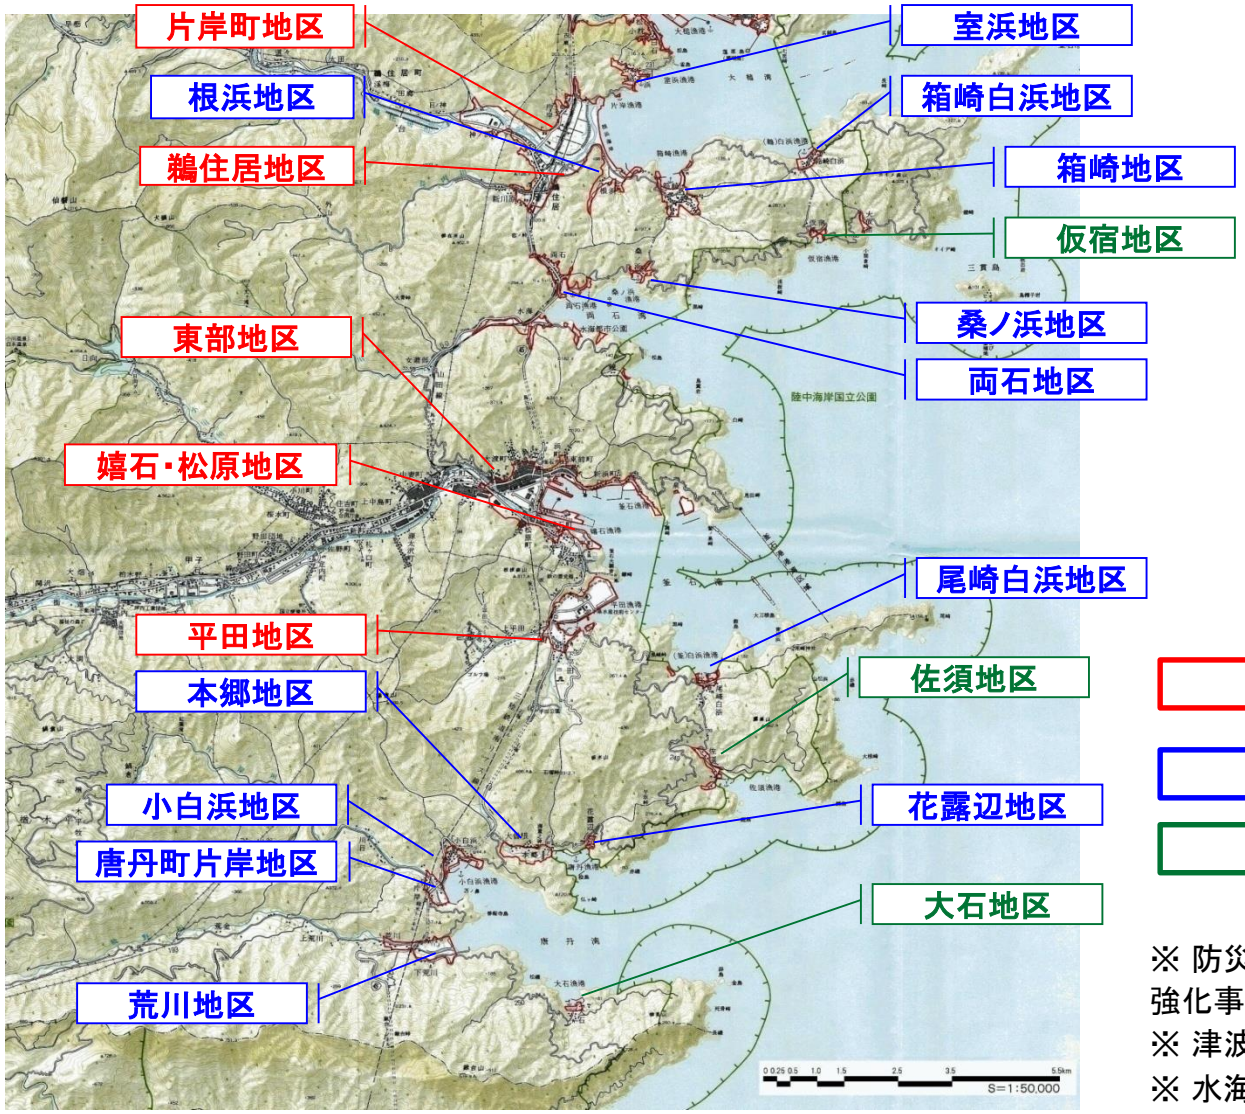

土地区画整理事業、津波復興拠点整備事業

防災集団移転促進事業

漁業集落防災機能強化事業

※ 防災集団移転促進事業には漁業集落防災機能強化事業を合わせて実施する地区を含む

※ 津波復興拠点整備事業は東部、鵜住居地区のみ

※ 水海地区は都市公園事業のみ

2-1　土地利用(2)

土地区画整理事業の進捗



分子	整備完了区画数	1,013
分母	全体整備予定区画数	1,056

「土地区画整理事業」とは？

・都市計画区域内の地域で、道路・公園などの公共施設や皆さんの土地を安全で利便性の高いものにするために、公共施設の整備改善や土地の区画形質の変更・集約化を行う

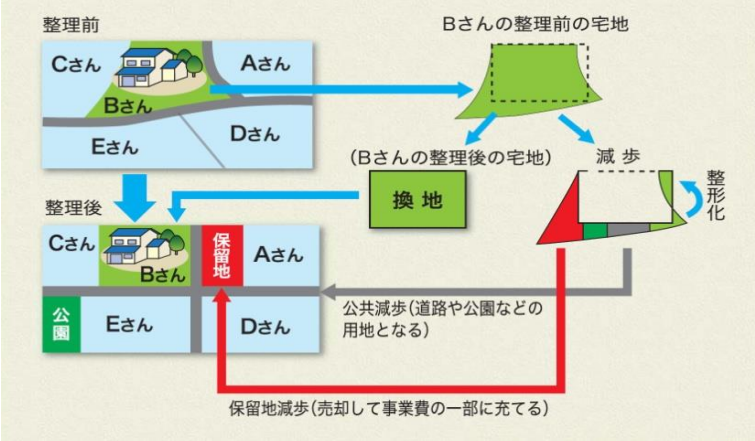

なお、釜石市の区画整理事業においては、保留地減歩は行いません。

スケジュール(予定)

計画策定・合意形成	平成23年10月～
調査・測量・設計	平成24年5月～ 平成25年3月
都市計画決定	平成24年11月
地権者連絡会	平成24年11月～
事業計画認可	平成25年3月
換地設計	平成25年3月～
審議会選挙等	平成25年4月～
仮換地指定	平成25年度下期
建物等の移転・工事	平成26年度下期～ 平成31年3月
換地処分	平成31年度以降

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-1　土地利用（3）

防災集団移転促進事業の進捗

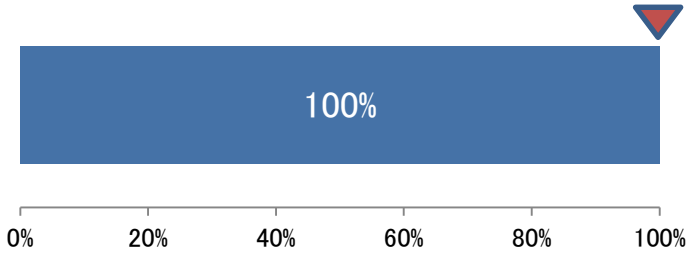

分子	整備完了区画数	123
分母	全体整備予定区画数	123

「防災集団移転促進事業」とは？

・災害の危険の恐れがある地域から住宅を移転するために、高台や造成地などの住宅団地を整備

・移転元の土地は住宅地としては利用不可

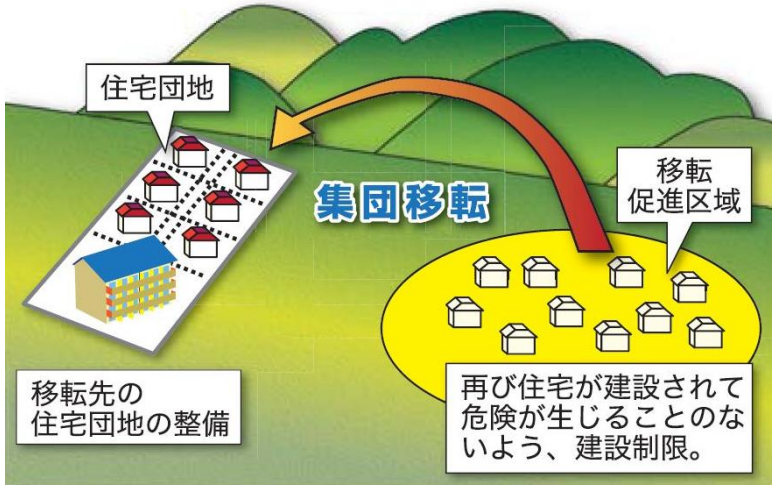

スケジュール（予定）

計画策定・合意形成	平成23年10月～
調査・測量・設計	平成24年4月～ 平成25年3月
防災集団移転促進事業大臣同意	平成24年6月　1地区 平成24年9月　7地区 平成24年10月　3地区
用地境界確認	平成24年10月～ 平成24年11月
地権者連絡会	平成24年11月～
不動産鑑定・用地買収	平成24年11月～
造成工事・道路工事等	平成25年5月～

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-1　土地利用(4)

漁業集落防災機能強化事業の進捗

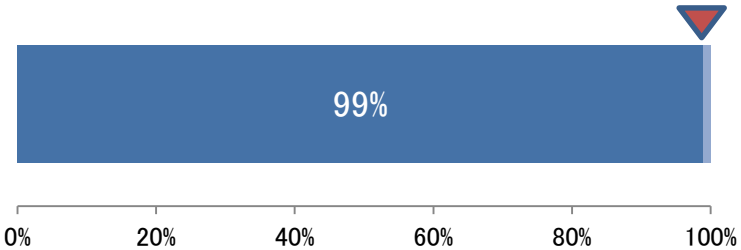

分子	整備完了区画数	90
分母	全体整備予定区画数	91

「漁業集落防災機能強化事業」とは？

・漁業集落において、安全安心な居住環境を確保するための地盤かさ上げ、生活基盤や防災安全施設の整備等を実施

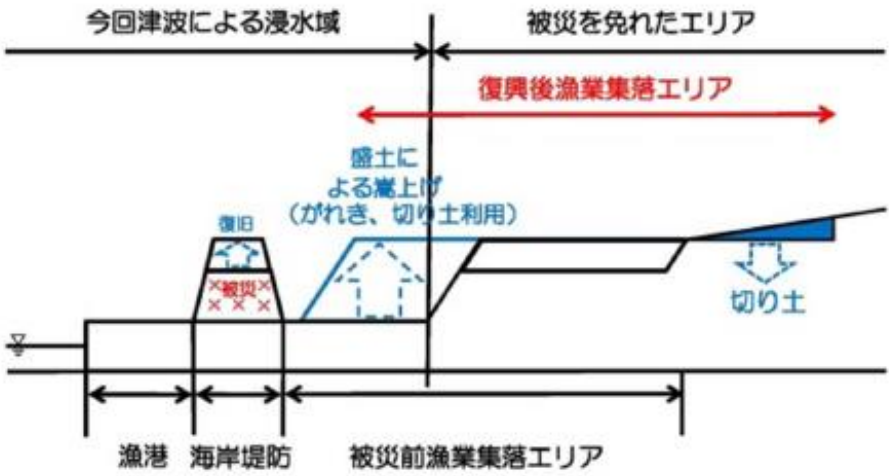

スケジュール（予定）

計画策定・合意形成	平成23年10月～
調査・測量・設計	平成24年4月～ 平成25年3月
用地境界確認	平成24年10月～ 平成24年11月
地権者連絡会	平成24年11月～
不動産鑑定・用地買収	平成24年11月～
造成工事・道路工事等	平成25年度～

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-1　土地利用(5)

用地買収の進捗



分子	買収面積	1,060,060 (+108,977)
分母	買収予定面積	1,108,017 (+75,928)

※ 買収予定面積は計画の進展により変更あり

単位：㎡

2-2　住まい(1)

復興公営住宅事業の進捗

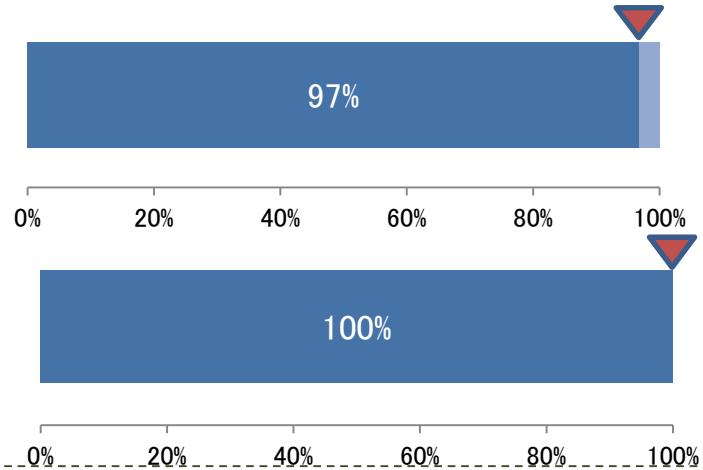

分子	建設済みの戸数	1,273 (0)
分母	計画戸数(予定)	1,316 (0)
分子	工事発注済みの戸数	1,316 (0)
分母	計画戸数(予定)	1,316 (0)

2-2 住まい(2)

住宅の自力再建の状況(全体)

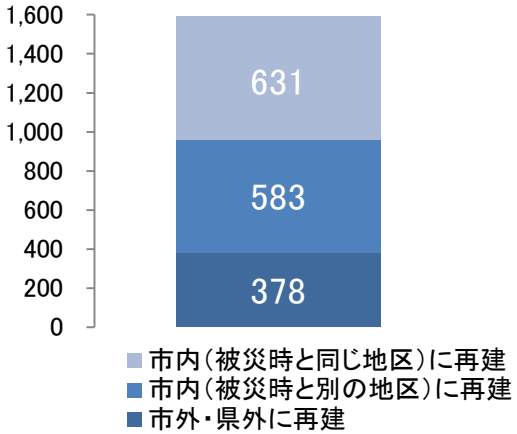

再建済み世帯数	1,592(+32)
市内(被災時と同じ地区)に再建	631(+28)
市内(被災時と別の地区)に再建	583(+ 4)
市外・県外に再建	378(0)

※生活再建支援金の「加算支援金(建設・購入)」を申請した世帯数

住宅の自力再建の状況(地区別)

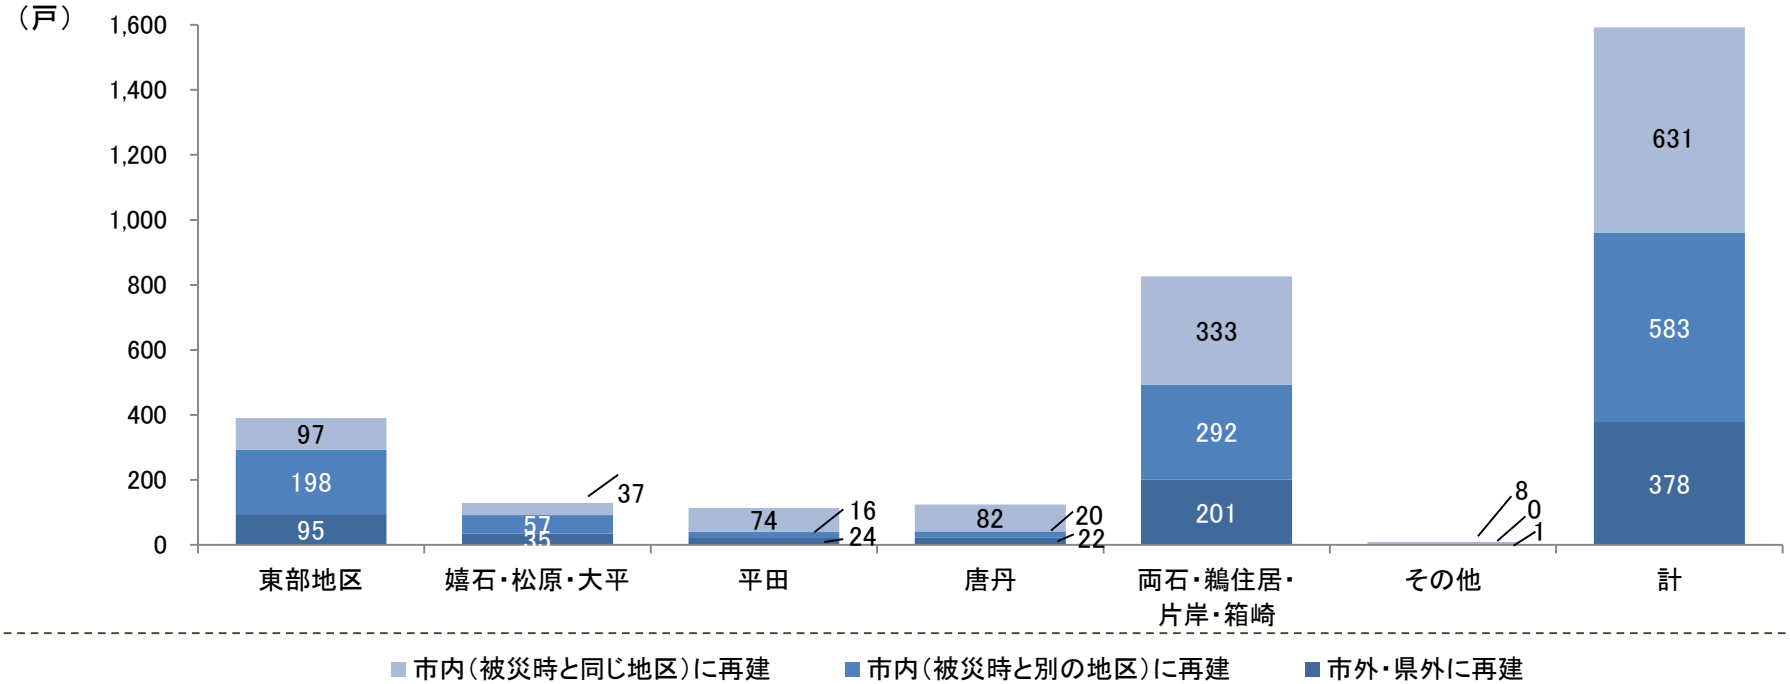

2-2 住まい（3-1）

応急仮設住宅入居戸数の推移

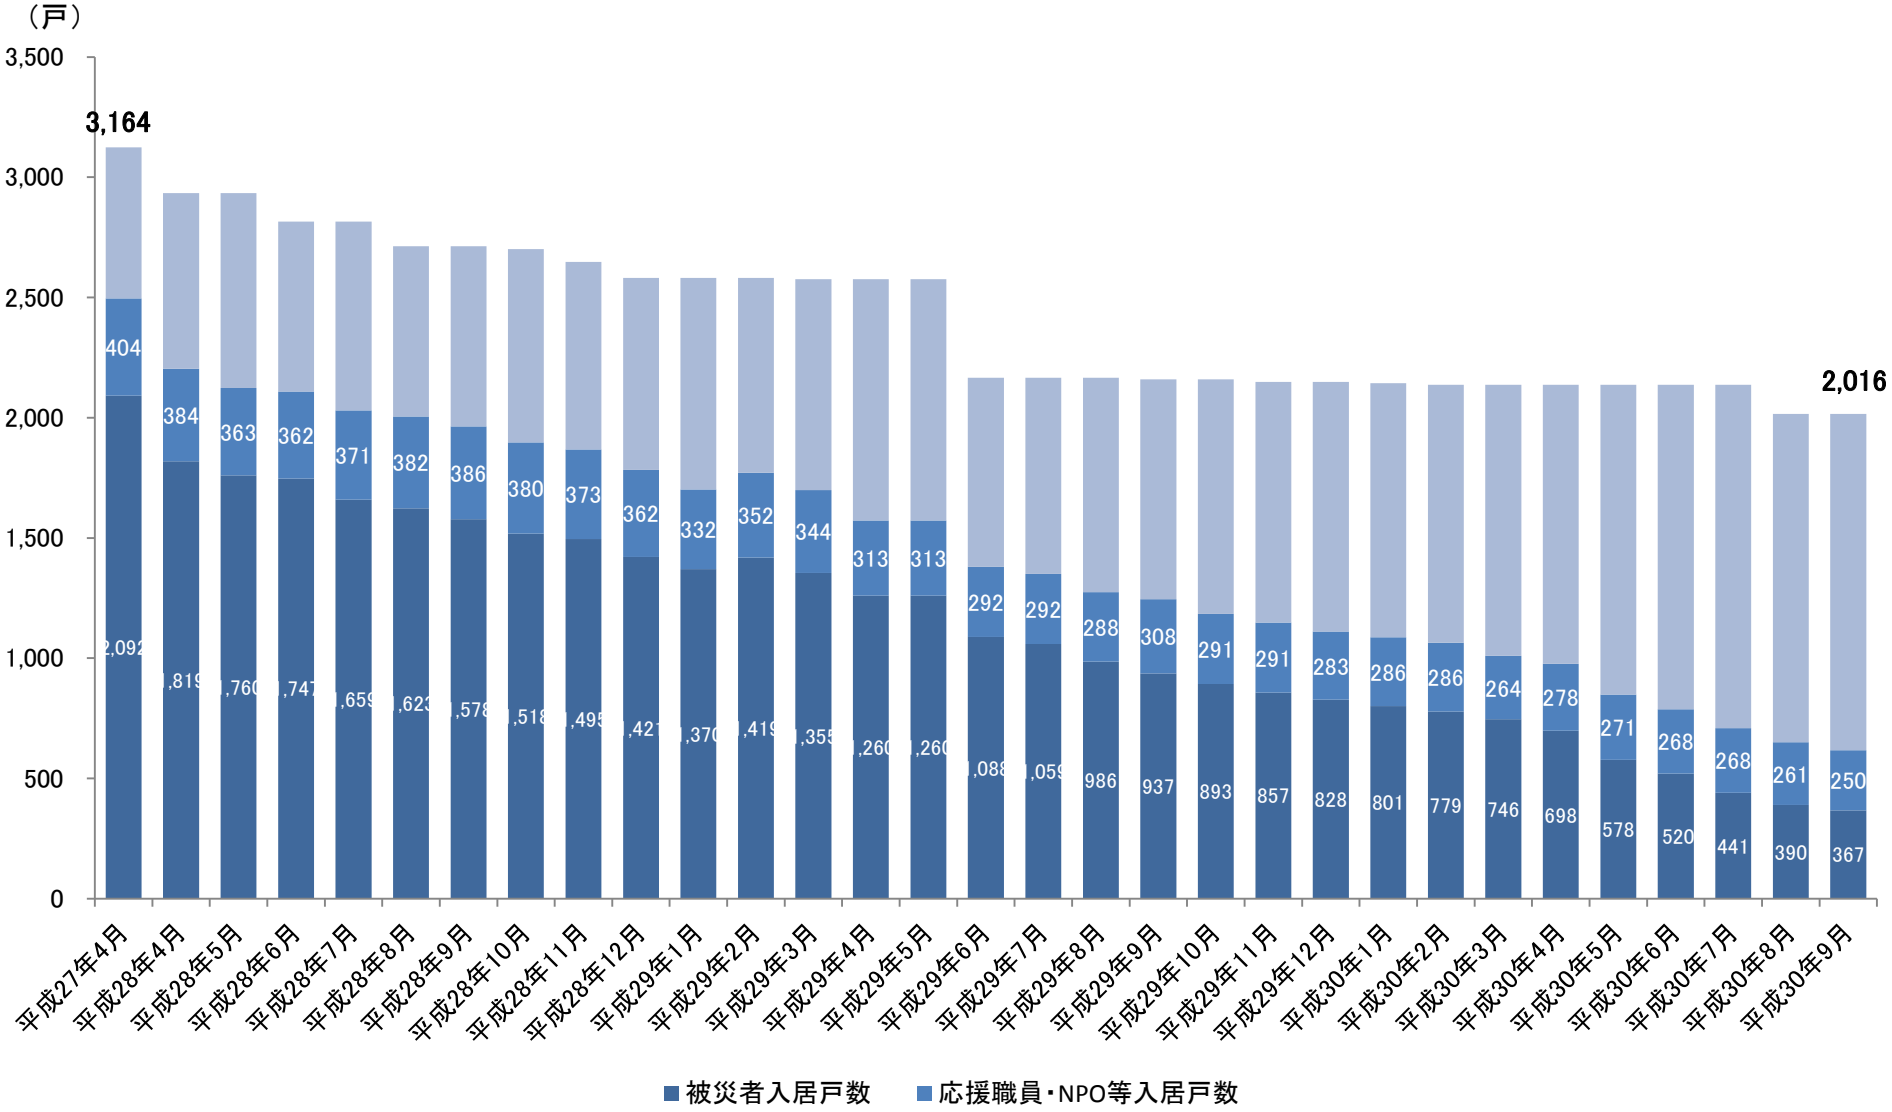

応急仮設住宅等の推移

		棟数	戸数
H25.9月末	平田第3（一部）	2棟	6戸
H26.10月末	唐丹町大石	1棟	6戸
H26.11月末	鵜住居町第5（一部）	6棟	28戸
H27.3月末	桜木町（一部）	9棟	54戸
H27.7月末	箱崎町第3（一部）	2棟	14戸
H27.8月末	鵜住居第4	6棟	24戸
H27.9月末	唐丹町上荒川	2棟	6戸
	平田第3（一部）	1棟	2戸
	唐丹町小白浜	9棟	49戸
H28.3月末	鵜住居町第5	8棟	41戸
H28.12月末	中妻町	18棟	118戸
H28.8月末	甲子町B	10棟	53戸
	唐丹町川目D（一部）	1棟	6戸
	甲子町C	8棟	36戸
	甲子町D	2棟	8戸
H28.11月末	大只越町	2棟	12戸
H28.12月末	甲子町第10	5棟	41戸
	鵜住居第3	2棟	12戸
H29.3月末	栗林町第2A・2B	15棟	66戸
	箱崎町第3（一部）	1棟	6戸
H29.8月末	甲子町A	5棟	28戸
	甲子町第9	13棟	120戸
	甲子町第6	14棟	138戸
	甲子町第4	11棟	66戸
	鵜住居町第7	4棟	16戸
H29.9月末	平田第5	8棟	42戸
H30.3月末	平田第4	5棟	13戸
	箱崎町D	1棟	6戸
	平田第3（一部）	1棟	4戸
H30.11月末（予定）	大平町第2	3棟	19戸
	甲子町第8	2棟	12戸
	唐丹町大曽根	4棟	29戸
	唐丹町川目C	4棟	25戸
	唐丹町川目D（一部）	1棟	6戸
H31.1月末（予定）	甲子町第7	7棟	36戸
		193棟	1,148戸

2-3 インフラ

漁港災害復旧事業（市漁港）の進捗

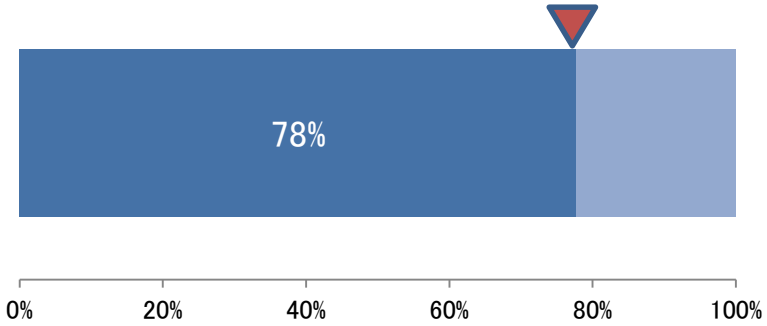

単位：箇所

分子	復旧完了漁港数	7
分母	復旧予定漁港数	9

海岸施設災害復旧事業（市防潮堤）の進捗

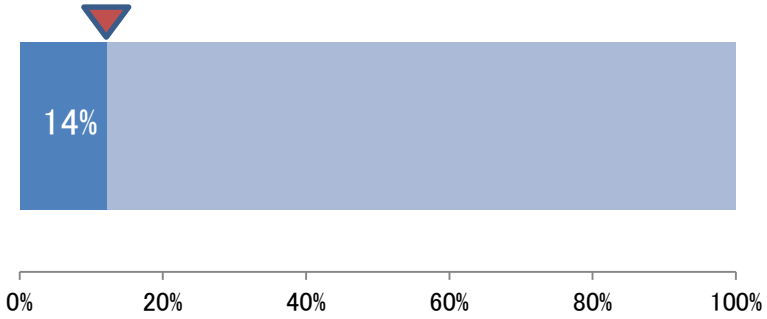

単位：箇所

分子	復旧完了防潮堤数	1
分母	復旧予定防潮堤数	7

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-4　産業・雇用(1)

水揚げ高(魚市場)

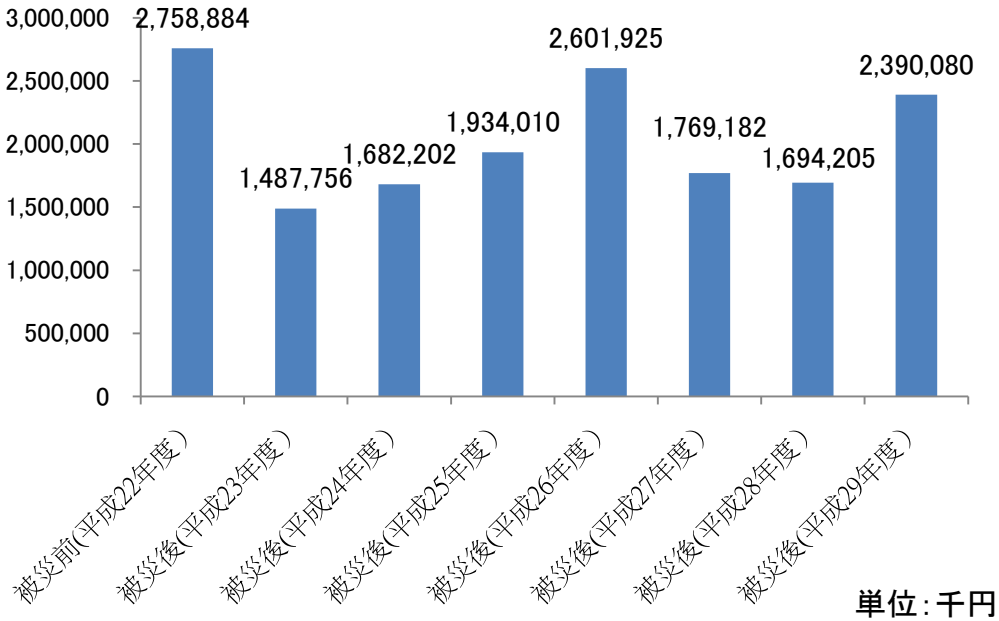

単位:千円

被災前(平成22年度)水揚げ高	2,758,884
被災後(平成23年度)水揚げ高	1,487,756
被災後(平成24年度)水揚げ高	1,682,202
被災後(平成25年度)水揚げ高	1,934,010
被災後(平成26年度)水揚げ高	2,601,925
被災後(平成27年度)水揚げ高	1,769,182
被災後(平成28年度)水揚げ高	1,694,205
被災後(平成29年度)水揚げ高	2,390,080

水産加工業企業数

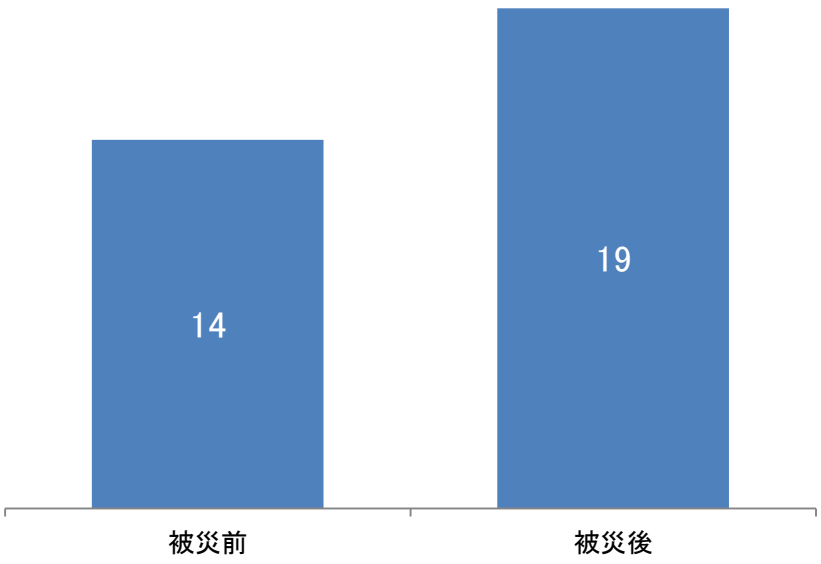

震災前の企業数	14
再開した企業数 (新規4を含む)	19

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-4 産業・雇用(2)

農地農業用施設災害復旧事業の進捗



分子	復旧農地面積	17.0
分母	復旧予定農地面積	20.3
(参考)	津波冠水農地面積	51.0

単位: ha

釜石市への観光客数

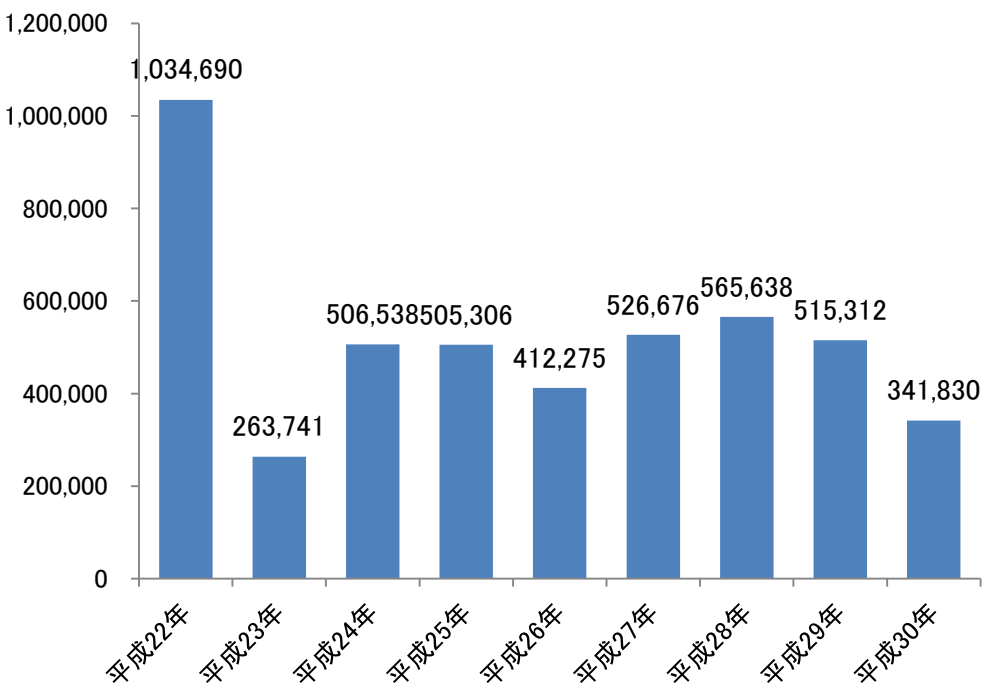

平成22年	1,034,690
平成23年	263,741
平成24年	506,538
平成25年	505,306
平成26年	412,275
平成27年	526,676
平成28年	565,638
平成29年	515,312
平成30年(8月末時点)	341,830

※1月～12月で集計

単位:人

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-4 産業・雇用(3)

釜石港港湾取扱貨物量

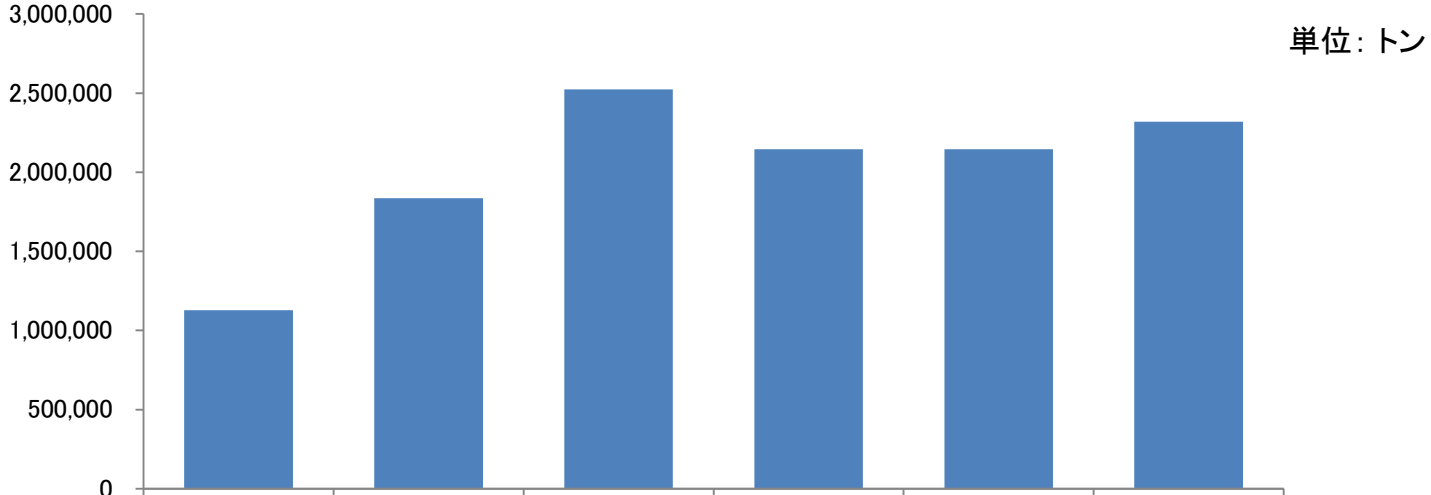

	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
合計	1,127,382	1,835,653	2,523,129	2,145,378	2,145,732	2,318,774

製造品出荷額等

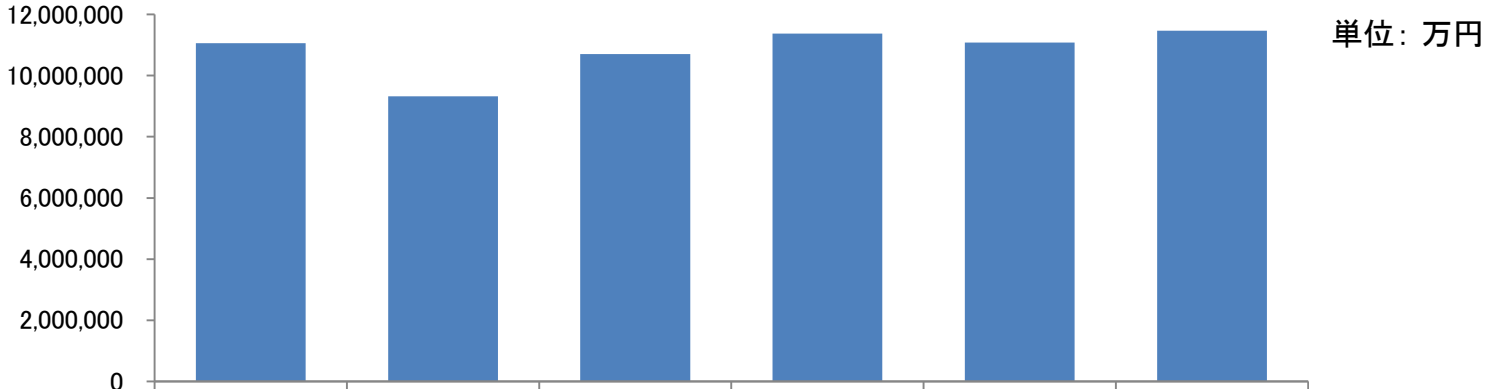

	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年
合計	11,063,101	9,323,770	10,702,866	11,375,369	11,079,111	11,472,917

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

釜石公共職業安定所釜石本所(釜石市・大槌町)の月別有効求人倍率

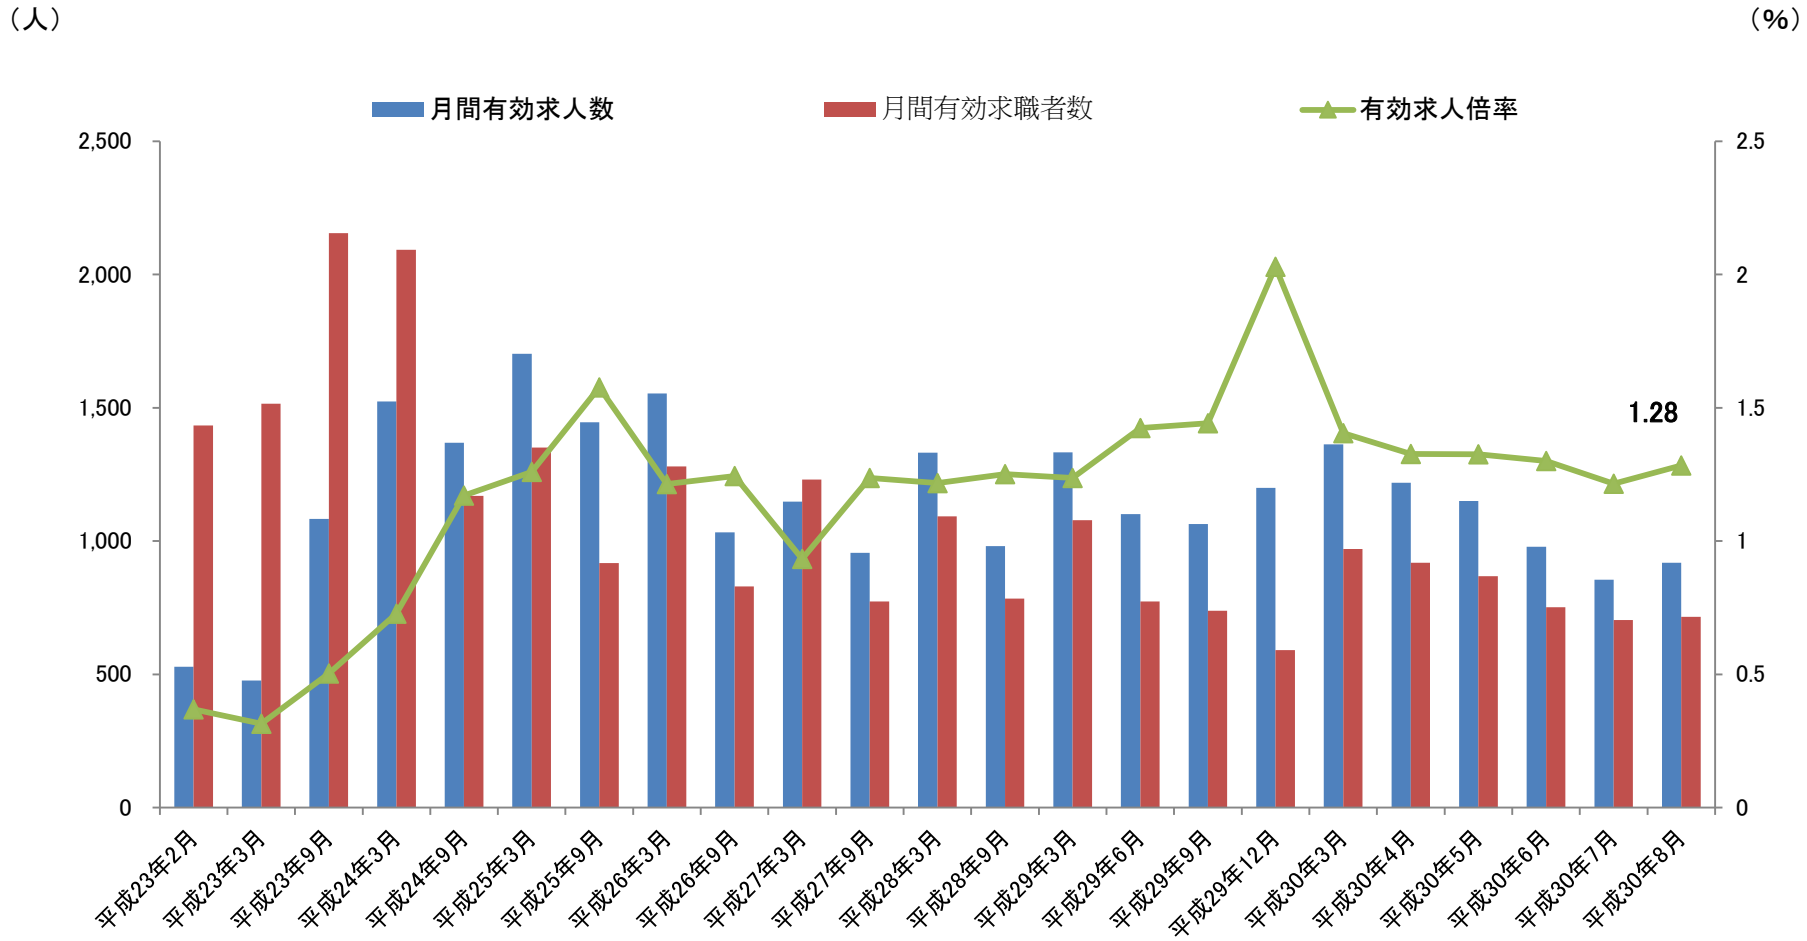

出典:釜石公共職業安定所

※有効求人数 :前月から繰り越された求人数と当月の新規求人数の合計数
有効求職者数:前月から繰り越された求職者数と当月の新規求職申し込み件数の合計数
有効求人倍率:求職者1人に対して何人分の求人があったかを示す指標

2-5 教育（1）

幼稚園・保育園復旧工事の進捗

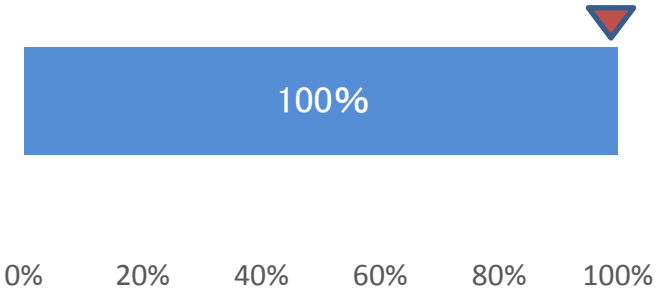

分子	復旧工事が完了した幼稚園・保育園の数 （幼稚園：平田、鵜住居）（保育園：鵜住居） （こども園：かまいし）	4
分母	被災した幼稚園・保育園の数 （幼稚園：平田、鵜住居）（保育園：釜石、鵜住居）	4

小学校復旧工事の進捗

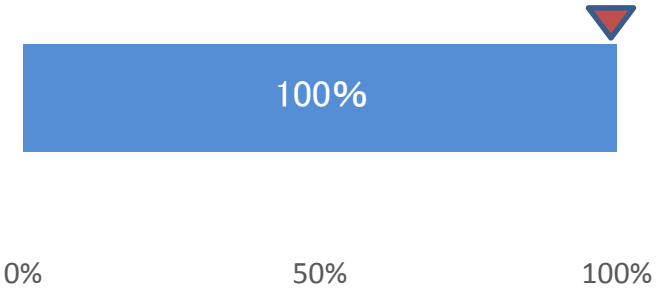

分子	復旧工事が完了した小学校の数 （釜石、双葉、甲子、白山、小佐野、平田、栗林、鵜住居、唐丹）	9
分母	被災した小学校の数 （釜石、双葉、甲子、白山、小佐野、平田、栗林、鵜住居、唐丹）	9

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-5 教育（2）

児童館・学童育成クラブ復旧工事の進捗

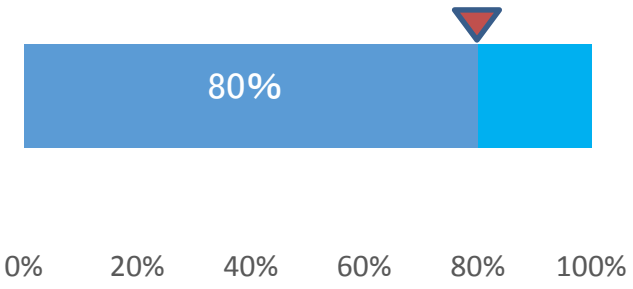

分子	復旧工事が完了した児童館・学童育成クラブの数 （児童館：鵜住居、唐丹）（学童育成クラブ：釜石、小佐野）	4
分母	被災した児童館・学童育成クラブの数 （釜石、小佐野、鵜住居、唐丹、箱崎）	5

※ 箱崎児童館は休止中。

中学校復旧工事の進捗

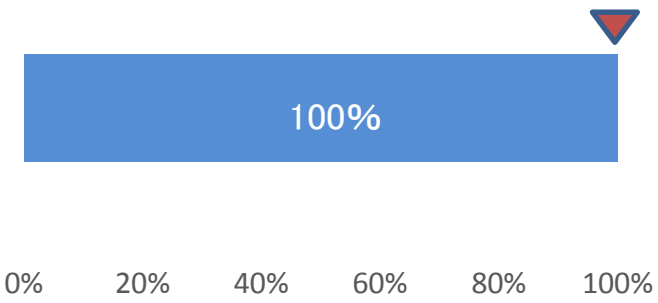

分子	復旧工事が完了した中学校の数 （釜石、大平、甲子、釜石東、唐丹）	5
分母	被災した中学校の数 （釜石、大平、甲子、釜石東、唐丹）	5

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-6 その他（1）

ボランティア受け入れの人数

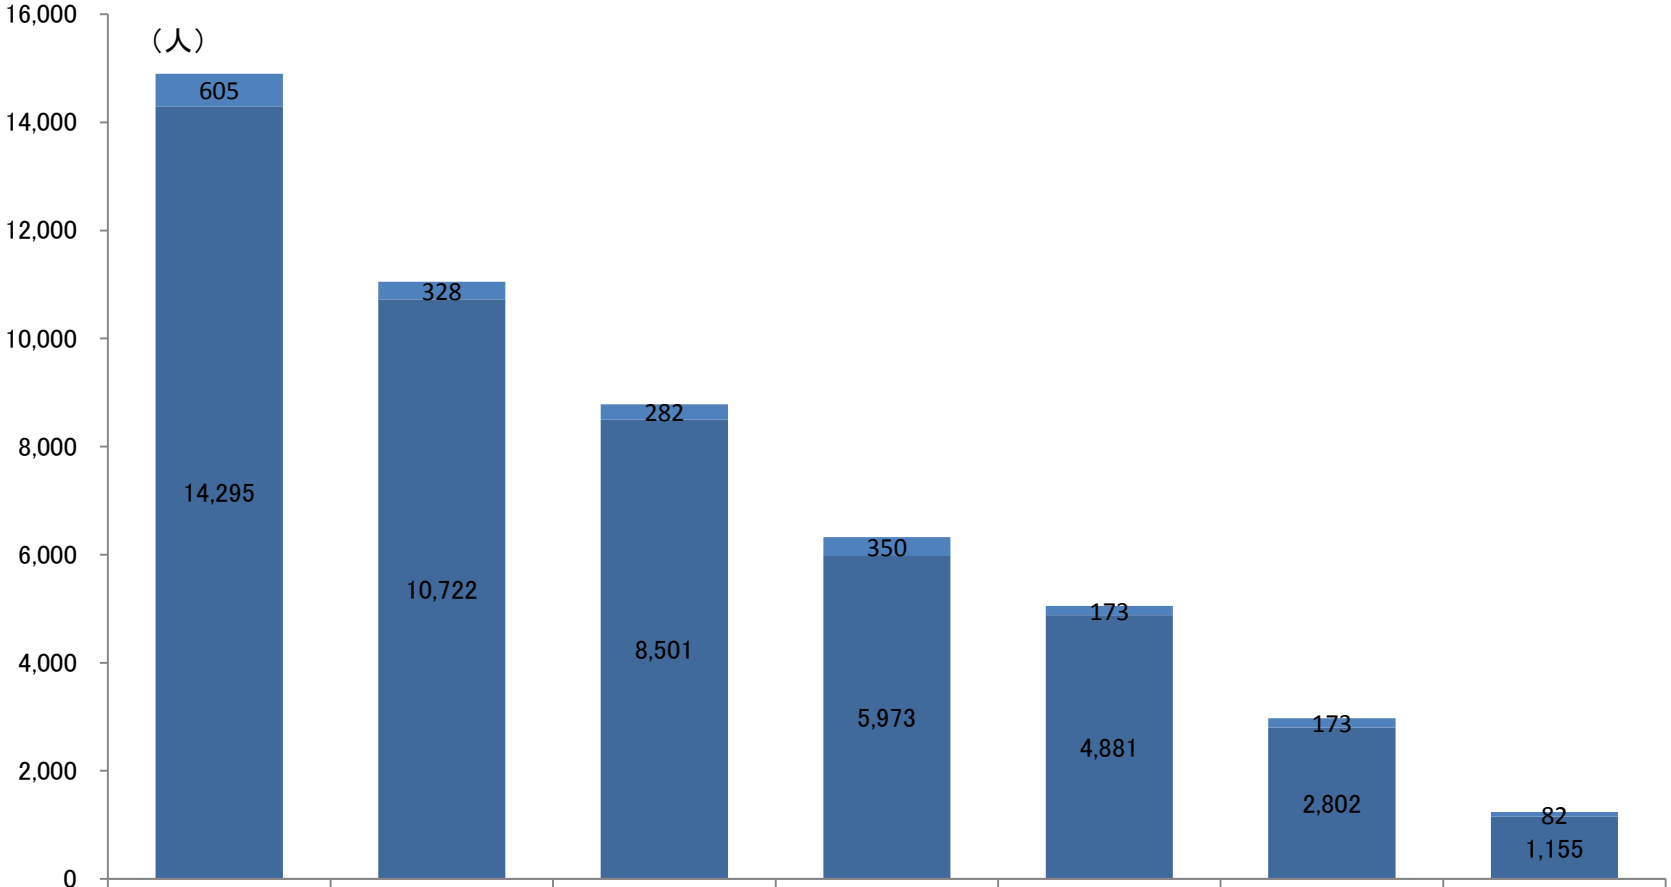

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度（9月末時点）
個人	605	328	282	350	173	173	82
団体	14,295	10,722	8,501	5,973	4,881	2,802	1,155

※釜石市社会福祉協議会で把握している人数

2-6 その他(2)

人口(月別)

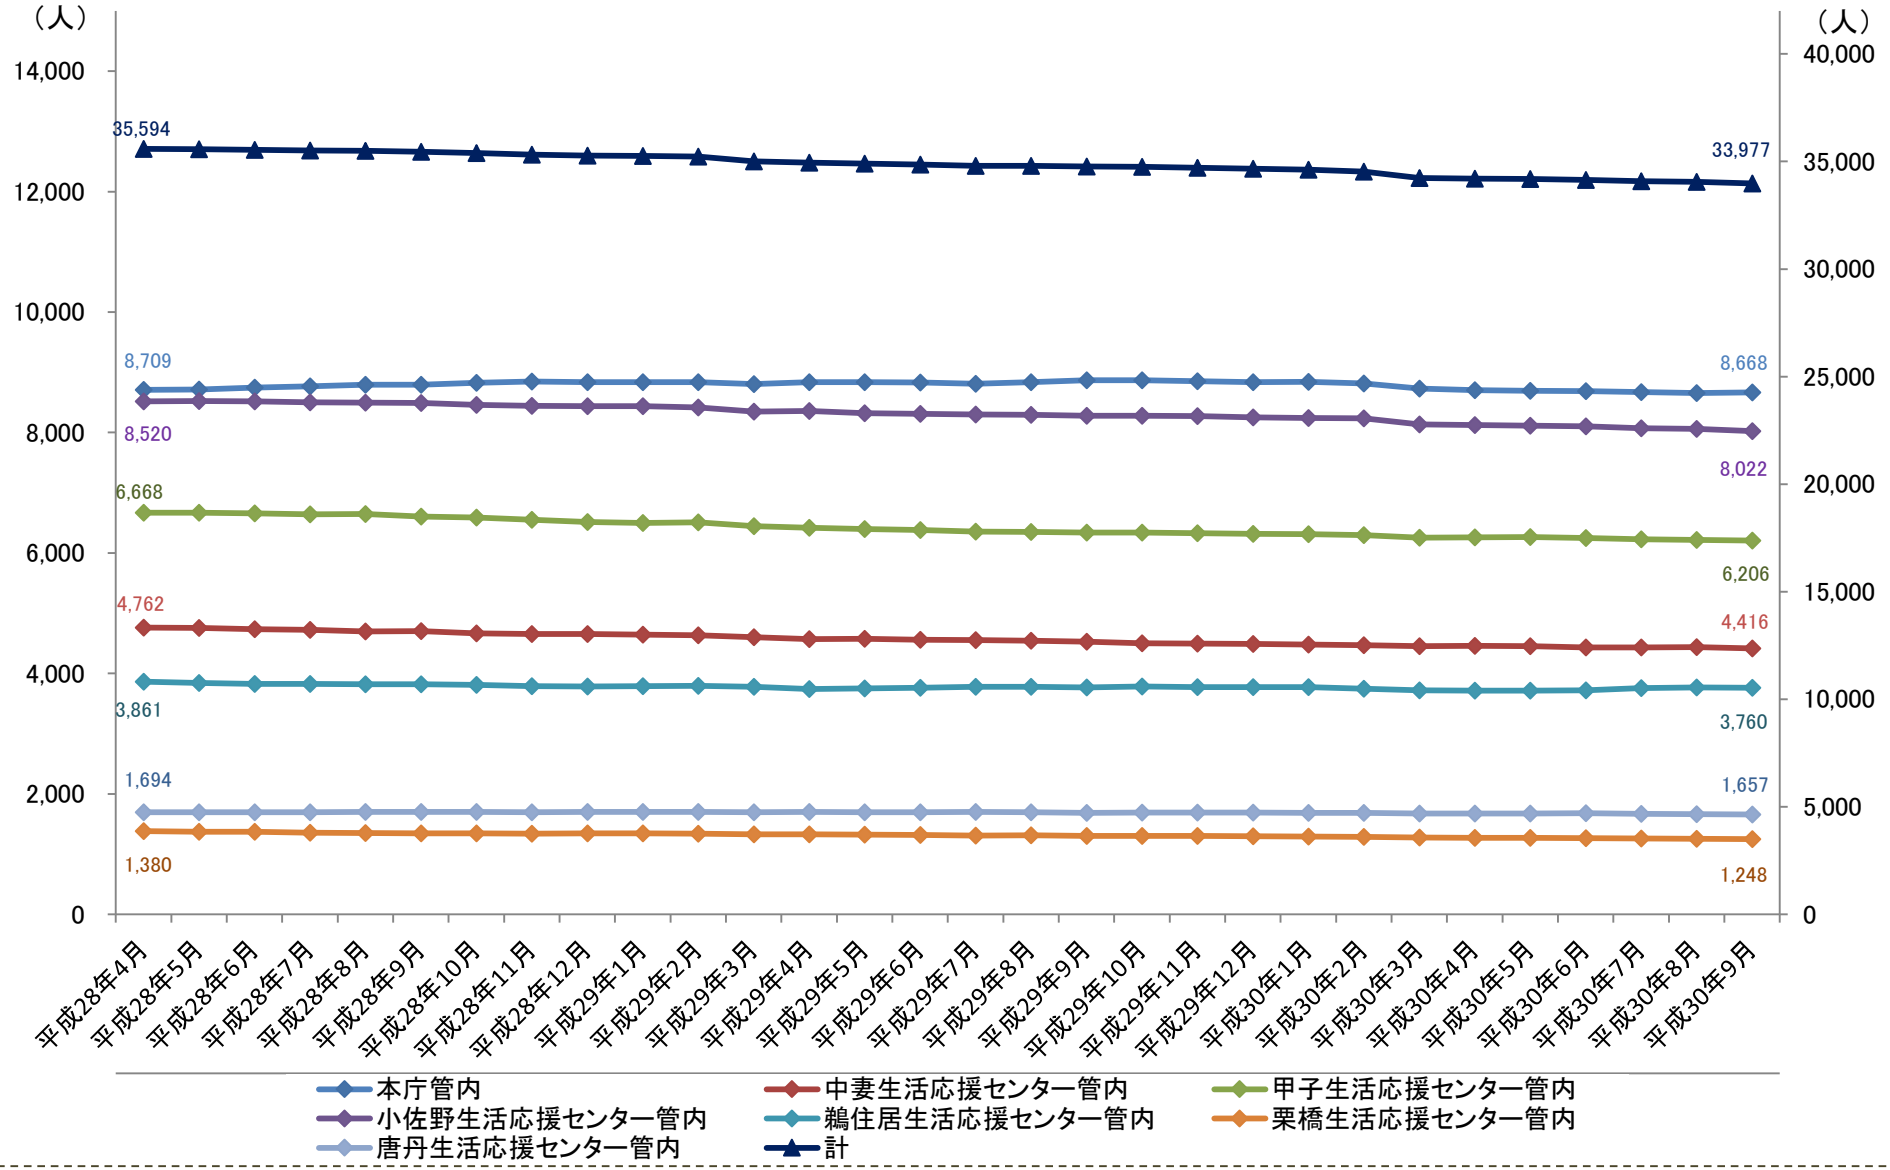
(人)
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
(人)
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
35,594
33,977
8,709
8,668
8,520
8,022
6,668
6,206
4,762
4,416
3,861
3,760
1,694
1,657
1,380
1,248
平成28年4月
平成28年5月
平成28年6月
平成28年7月
平成28年8月
平成28年9月
平成28年10月
平成28年11月
平成28年12月
平成29年1月
平成29年2月
平成29年3月
平成29年4月
平成29年5月
平成29年6月
平成29年7月
平成29年8月
平成29年9月
平成29年10月
平成29年11月
平成29年12月
平成30年1月
平成30年2月
平成30年3月
平成30年4月
平成30年5月
平成30年6月
平成30年7月
平成30年8月
平成30年9月
本庁管内
中妻生活応援センター管内
甲子生活応援センター管内
小佐野生活応援センター管内
鵜住居生活応援センター管内
栗橋生活応援センター管内
唐丹生活応援センター管内
計

2-6 その他(3)

人口(社会動態)

平成30年度

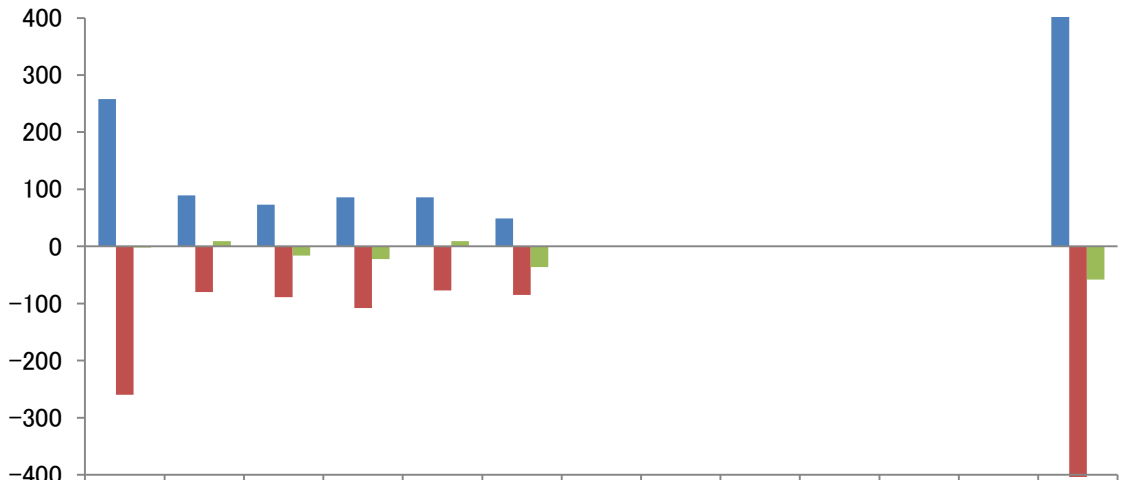

	30年4月	30年5月	30年6月	30年7月	30年8月	30年9月	30年10月	30年11月	30年12月	31年1月	31年2月	31年3月	累計
転入	258	89	73	86	86	49							641
転出	−260	−80	−89	−108	−77	−85							−699
増減	−2	9	−16	−22	9	−36	0	0	0	0	0	0	−58

	転入	転出	増減
平成24年度	1,292	−1,347	−55
平成25年度	1,252	−1,443	−191
平成26年度	1,270	−1,344	−74
平成27年度	1,205	−1,311	−106
平成28年度	1,155	−1,274	−119
平成29年度	1,031	−1,414	−383
平成30年度(9月末まで)	641	−699	−58
計	7,846	−8,832	−986

2-6 その他(4)

被災地派遣職員の人数

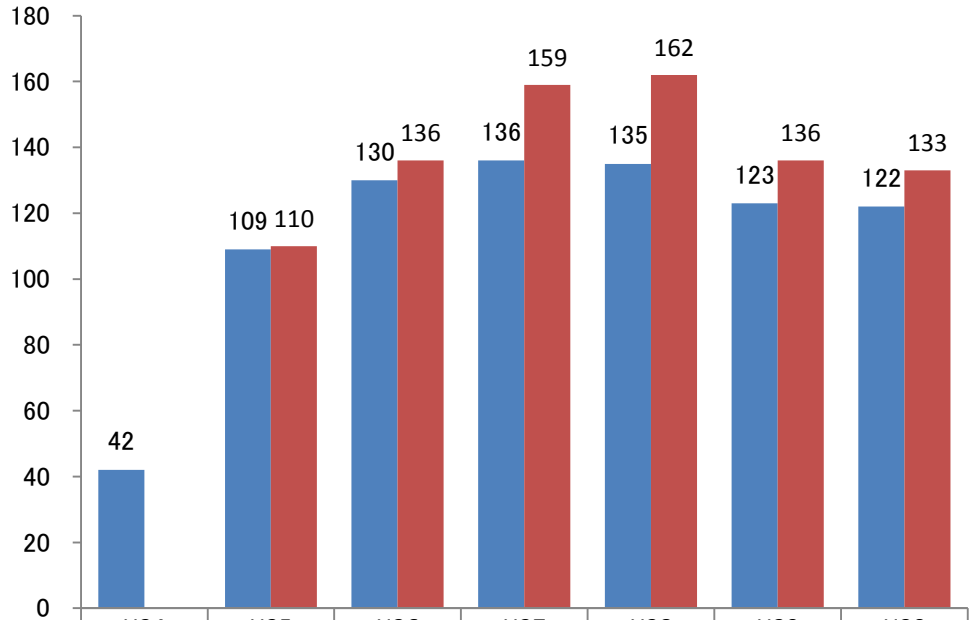

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
充足人数	42	109	130	136	135	123	122
要望人数		110	136	159	162	136	133

充足率	
平成24年度	–
平成25年度	99%
平成26年度	96%
平成27年度	86%
平成28年度	83%
平成29年度	90%
平成30年度	92%

2-7 完了項目

項目	指標	数値	単位
土地利用			
災害廃棄物処理の完了数	完了総量	946	千t
インフラ			
道路災害復旧事業の進捗	工事が完了した市道の箇所数	65	箇所
橋りょう復旧事業の進捗	工事が完了した橋りょうの箇所数	9	箇所
河川改修事業の進捗	工事が完了した箇所数	15	箇所
下水道施設災害復旧事業の進捗	復旧工事が完了した施設箇所（管路施設）	8	箇所

3 問い合わせ先

分類	項目	問い合わせ先	
	全体	復興推進本部事務局	0193-27-8479
2-1 土地利用	土地区画整理事業	復興推進本部都市整備推進室	0193-27-8437
	防災集団移転促進事業		
	漁業集落防災機能強化事業		
	用地買収		
2-2 住まい	復興公営住宅整備事業	建設部都市計画課復興住宅整備室	0193-27-8435
	住宅の自力再建(生活再建支援金)	保健福祉部地域福祉課	0193-22-0177
	応急仮設住宅入居戸数	復興推進本部生活支援室	0193-22-8253/8254
2-3 インフラ	漁港災害復旧事業(市漁港)	産業振興部水産課	0193-27-8427
	海岸施設災害復旧事業(市防潮堤)		
2-4 産業・雇用	水揚げ高(魚市場)	産業振興部水産課	
	水産加工業企業数		
	農地農業用施設災害復旧事業	産業振興部農林課	0193-27-8426
	観光客数	産業振興部商業観光課	0193-27-8421
	釜石港港湾取扱貨物量	産業振興部国際港湾振興課	0193-27-8425
	製造品出荷額等	総務企画部総合政策課	0193-27-8413
	月別有効求人倍率	産業振興部商業観光課	0193-27-8421
2-5 教育	幼稚園・保育園復旧工事	教育委員会総務課 保健福祉部子ども課	0193-22-8832 0193-22-5121
	小学校復旧工事		
	児童館・学童育成クラブ復旧事業		
	中学校復旧工事		
2-6 その他	ボランティア受入数	社会福祉協議会	0193-24-2511
	人口(月別・社会動態)	市民生活部市民課	0193-27-8450
	被災地派遣職員の人数	総務企画部総務課	0193-27-8411
2-7 完了項目	道路災害復旧事業	建設部建設課	0193-27-8430
	橋りょう復旧事業		
	河川改修事業		
	下水道施設災害復旧事業	建設部下水道課	0193-22-1061
